

แผนงานก่อสร้างห้วยขาแข้ง

แผนงานหลักแบบบูรณาการสำหรับข้อเสนอ · BASELINE v0.8

ระยะเวลาโครงการ	งวดงาน	กิจกรรม	จุดควบคุม	กิจกรรมวิกฤต
1,200 วัน	497	1066	258	60

ช่วงควบคุมโครงการและรอบกิจกรรมวิกฤต

ช่วงควบคุม / ขอบเขต	วันโครงการ	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
CP-01 งานสำรวจ หมดอ้างอิง และการอนุมัติเริ่มต้น	D1–D90											
CP-02 ระบบชั่วคราวและความพร้อมเปิดพื้นที่ก่อสร้าง	D31–D180											
CP-03 งานออกแบบ การอนุมัติ และการจัดหาวัสดุระยะยาว	D31–D270											
CP-04 งานฐานรากและโครงสร้างหลัก — พื้นที่ A	D181–D600											
CP-05 งานสถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคาร — พื้นที่ A	D421–D840											
CP-06 พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก	D301–D960											
CP-07 งานภูมิทัศน์ เก็บรายละเอียด และบูรณาการระบบ	D841–D1080											
CP-08 งานทดสอบระบบ แบบก่อสร้างจริง คู่มือ และส่งมอบ	D1081–D1200											

สรุปแผนที่ 01–16

แผน / สายงาน	จำนวน	ช่วงวัน	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ	688	D1–D1200											
แผนที่ 02 — แผนงบประมาณก่อสร้าง	17	D1–D1195											
แผนที่ 03 — แผนการจัดการสถานที่ก่อสร้าง	14	D1–D1110											
แผนที่ 04 — แผนอัตราค่าจ้าง	9	D1–D1200											
แผนที่ 05 — แผนการใช้เครื่องจักรกล	8	D1–D1170											
แผนที่ 06 — แผนการจัดหาวัสดุ	60	D31–D500											
แผนที่ 07 — แผนควบคุมคุณภาพ	24	D1–D1180											
แผนที่ 08 — แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	61	D1–D1080											
แผนที่ 09 — แผนจราจร	9	D1–D1170											
แผนที่ 10 — แผนลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	35	D1–D1140											
แผนที่ 11 — แผนบริหารจัดการเอกสารโครงการ	89	D1–D1200											
แผนที่ 12 — แผนบริหารและติดตามความก้าวหน้า	9	D1–D1200											
แผนที่ 13 — แผนการใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร	16	D1–D1180											
แผนที่ 14 — แผนการใช้โปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์	9	D1–D1190											
แผนที่ 15 — แผนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์	9	D1–D1185											
แผนที่ 16 — แผนป้องกันผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก	9	D1–D1110											

ผลตรวจ: PASS · เครือข่ายงานก่อสร้างแผนที่ 01 เชื่อมครบ NTPD1200

กิจกรรมกิจกรรมวิกฤตจุดควบคุมขอบเขตรอยืนยัน

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งานตงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า		D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ						688 กิจกรรม																				
งานอำนวยการและเตรียมการ						5 กิจกรรม																				
งานอำนวยการและเตรียมการ						5 กิจกรรม																				
01.1.01	จุดเริ่มต้นโครงการตามหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน P01-PRE-NTP · งานอำนวยการและเตรียมการ	จุด	D1	D1	–																					
01.1.02	งานสำรวจควบคุมโครงการ หมุดอ้างอิง X-Y-Z และบันทึกสภาพเดิม P01-PRE-SUR · งานอำนวยการและเตรียมการ	90 วัน	D1	D90	P01-PRE-NTP																					
01.1.03	จัดตั้งสำนักงานสนาม ระบบชั่วคราว รั้ว ทางเข้า และมาตรการความปลอดภัย P01-PRE-TEMP · งานอำนวยการและเตรียมการ	150 วัน	D31	D180	P01-PRE-NTP+30																					
01.1.04	งานออกแบบรายละเอียด การอนุมัติ และควบคุมการจัดหาวัสดุระยะยาว P01-PRE-DES · งานอำนวยการและเตรียมการ	240 วัน	D31	D270	P01-PRE-NTP+30																					
01.1.05	จุดอนุมัติความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้างหลัก P01-PRE-REL · งานอำนวยการและเตรียมการ	จุด	D181	D181	P01-PRE-TEMP+1; P12-PRG-004; P03-SITE-A-REL; P02-M24																					
โซนทางเข้า–ออกหลัก						17 กิจกรรม																				
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม																				
01.2.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A21-REL · โซนทางเข้า–ออกหลัก	จุด	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...																					
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม																				
01.2.1.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A21-SUR · โซนทางเข้า–ออกหลัก	14 วัน	D181	D194	P01-A21-REL																					
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม																				
01.2.1.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A21-EW · โซนทางเข้า–ออกหลัก	44 วัน	D199	D242	P01-A21-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-A21-CIV-DOC; P08-A21-EARTH-PTW; P1...																					
01.2.1.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A21-BASE · โซนทางเข้า–ออกหลัก	58 วัน	D247	D304	P01-A21-DRN(SS); P11-A21-CIV-DOC																					
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม																				
01.2.1.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-A21-ELE · โซนทางเข้า–ออกหลัก · รอยืนยันขอบเขต	57 วัน	D291	D347	P01-A21-UTIL(SS); P11-A21-UTIL-DOC																					
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม																				
01.2.1.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-A21-PAVE · โซนทางเข้า–ออกหลัก	54 วัน	D286	D339	P01-A21-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A21-LAND-DOC																					
01.2.1.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จัดเรียนรู้ P01-A21-FURN · โซนทางเข้า–ออกหลัก	43 วัน	D323	D365	P01-A21-PAVE(SS)																					
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม																				
01.2.1.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A21-SOIL · โซนทางเข้า–ออกหลัก	45 วัน	D308	D352	P01-A21-EW; P11-A21-LAND-DOC																					
01.2.1.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-A21-SOFT · โซนทางเข้า–ออกหลัก	40 วัน	D339	D378	P01-A21-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A21-LAND-DOC																					
01.2.1.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A21-IRR · โซนทางเข้า–ออกหลัก	49 วัน	D339	D387	P01-A21-UTIL; P01-A21-SOFT(SS); P11-A21-LAND-DOC																					
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม																				
01.2.1.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A21-DRN · โซนทางเข้า–ออกหลัก	60 วัน	D214	D273	P01-A21-EW(SS)+11; P11-A21-CIV-DOC																					

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.1.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A21-UTIL · โชนทางเข้า-ออกหลัก · รอยืนยันขอบเขต	67 วัน	D229	D295	P01-A21-EW(SS)*18; P06-STR-10; P11-A21-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.2.1.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาระหว่างก่อสร้าง P01-A21-MON · โชนทางเข้า-ออกหลัก	200 วัน	D192	D391	P01-A21-CTRL(SS)											
01.2.1.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A21-REST · โชนทางเข้า-ออกหลัก	23 วัน	D374	D396	P01-A21-SOFT(SS); P01-A21-PAVE											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.2.1.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A21-FIN · โชนทางเข้า-ออกหลัก	9 วัน	D391	D399	P01-A21-REST(SS); P01-A21-ELE; P01-A21-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.1.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A21-HO · โชนทางเข้า-ออกหลัก	จุด	D400	D400	P01-A21-FIN; P01-A21-FURN; P01-A21-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.2.1.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซา ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A21-CTRL · โชนทางเข้า-ออกหลัก	20 วัน	D188	D207	P01-A21-SUR(SS)											
จุดรับส่งผู้โดยสาร						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A22-REL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D220	D220	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.2.2.02	งานสำรวจ บักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A22-SUR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	14 วัน	D220	D233	P01-A22-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.2.2.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A22-EW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45 วัน	D238	D282	P01-A22-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-A22-CIV-DOC; P08-A22-EARTH-PTW; P1...											
01.2.2.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A22-BASE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	58 วัน	D286	D343	P01-A22-DRN(SS); P11-A22-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.2.2.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-A22-ELE · จุดรับส่งผู้โดยสาร · รอยืนยันขอบเขต	58 วัน	D330	D387	P01-A22-UTIL(SS); P11-A22-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.2.2.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-A22-PAVE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	53 วัน	D326	D378	P01-A22-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A22-LAND-DOC											
01.2.2.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A22-FURN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	43 วัน	D363	D405	P01-A22-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.2.2.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A22-SOIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45 วัน	D348	D392	P01-A22-EW; P11-A22-LAND-DOC											
01.2.2.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-A22-SOFT · จุดรับส่งผู้โดยสาร	41 วัน	D378	D418	P01-A22-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A22-LAND-DOC											
01.2.2.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A22-IRR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	50 วัน	D378	D427	P01-A22-UTIL; P01-A22-SOFT(SS); P11-A22-LAND-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.2.2.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A22-DRN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	60 วัน	D253	D312	P01-A22-EW(SS)+11; P11-A22-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.2.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A22-UTIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร · รอยืนยันขอบเขต	67 วัน	D268	D334	P01-A22-EW(SS)+18; P06-STR-10; P11-A22-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.2.2.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A22-MON · จุดรับส่งผู้โดยสาร	201 วัน	D231	D431	P01-A22-CTRL(SS)											
01.2.2.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A22-REST · จุดรับส่งผู้โดยสาร	23 วัน	D414	D436	P01-A22-SOFT(SS); P01-A22-PAVE											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.2.2.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A22-FIN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	9 วัน	D431	D439	P01-A22-REST(SS); P01-A22-ELE; P01-A22-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.2.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A22-HO · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D440	D440	P01-A22-FIN; P01-A22-FURN; P01-A22-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.2.2.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A22-CTRL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	20 วัน	D227	D246	P01-A22-SUR(SS)											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						44 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A23-REL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.2.3.02	งานปรับบริเวณสำรวจ และปักผัง P01-A23-SUR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	24 วัน	D181	D204	P01-A23-REL											
01.2.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A23-EXC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	60 วัน	D201	D260	P01-A23-SUR(SS)+20; P05-PLT-EARTH(SS); P08-A23-EARTH-PTW; P10-A23-EARTH-ENV											
01.2.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A23-BLI · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	31 วัน	D250	D280	P01-A23-EXC(SS)+49											
01.2.3.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A23-RBF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34 วัน	D283	D316	P01-A23-BLI+2; P06-STR-10; P11-A23-STR-DOC											
01.2.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A23-FMF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34 วัน	D286	D319	P01-A23-BLI; P11-A23-STR-DOC											
01.2.3.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A23-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D319	D319	P01-A23-RBF+3; P01-A23-FMF											
01.2.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A23-FND · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	38 วัน	D319	D356	P01-A23-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A23-GB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74 วัน	D342	D415	P01-A23-FND(SS)+23; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A23-FRM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126 วัน	D392	D517	P01-A23-GB(SS)+50; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A23-ROOF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77 วัน	D481	D557	P01-A23-FRM(SS)+46; P05-PLT-STR(SS); P08-A23-WAH											

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ · งานโครงสร้าง

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.2.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A23-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	76 วัน	D534	D609	P01-A23-ROOF(SS)+20; P06-ARC-10; P11-A23-ARC-DOC											
01.2.3.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-A23-EWALL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126 วัน	D491	D616	P01-A23-FRM(SS)+53; P06-ARC-10; P11-A23-ARC-DOC											
01.2.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A23-PART · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	117 วัน	D520	D636	P01-A23-FRM(SS)+66; P11-A23-ARC-DOC											
01.2.3.20	งานผนังและคิผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A23-WFIN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	97 วัน	D609	D705	P01-A23-PART(SS)+86; P01-A23-MEP1(SS)+20											
01.2.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A23-DRW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	106 วัน	D613	D718	P01-A23-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.3.22	งานโครงฝ้า ตรวระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A23-CEIL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	84 วัน	D655	D738	P01-A23-MEP1(SS)+66; P07-A23-CEIL-HOLD											
01.2.3.23	งานตกแต่งคิพื้น P01-A23-FLR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	90 วัน	D652	D741	P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.24	งานทาสีและเก็บคิสถาปัตยกรรม P01-A23-PNT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73 วัน	D702	D774	P01-A23-WFIN(SS)+26; P01-A23-CEIL(SS)											
01.2.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A23-SAN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	71 วัน	D711	D781	P01-A23-PLB1; P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A23-FURN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73 วัน	D725	D797	P01-A23-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.2.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A23-MEP1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	149 วัน	D504	D652	P01-A23-FRM(SS)+112; P05-PLT-MEP(SS); P11-A23-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.2.3.16	งานต่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A23-ELE1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136 วัน	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS)+7; P05-PLT-MEP(SS); P11-A23-MEP-DOC											
01.2.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงคิระยะที่ 2 P01-A23-ELE2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74 วัน	D711	D784	P01-A23-ELE1; P01-A23-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.3.32.T01	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P01-A23-ETST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7 วัน	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.2.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A23-PLB1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136 วัน	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A23-MEP-DOC											
01.2.3.32.T02	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P01-A23-PTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7 วัน	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						3 กิจกรรม										
01.2.3.18	งานท่ลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A23-HV1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136 วัน	D520	D655	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A23-MEP-DOC											
01.2.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A23-HV2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77 วัน	D715	D791	P01-A23-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.3.32.T03	งานทดสอบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบควบคุม — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P01-A23-HTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7 วัน	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
งานระบบพิเศษ						4 กิจกรรม										
01.2.3.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และสัตทศนุภัณฑ์ระยะที่ 1 P01-A23-ICT1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	116 วัน	D550	D665	P01-A23-ELE1(SS)+39; P05-PLT-MEP(SS); P11-A23-MEP-DOC											

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ · งานระบบพิเศษ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบพิเศษ (ต่อ)						4 กิจกรรม										
01.2.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก	73 วัน	D725	D797	P01-A23-ICT1+59; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
	P01-A23-ICT2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ															
01.2.3.32.T04		งานทดสอบระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุม — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7 วัน	D808	D814	P01-A23-PRECOM										
		P01-A23-ITST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
01.2.3.37.03		งานเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบัตรและห้องควบคุม กรณีอยู่ในขอบเขต	80 วัน	D721	D800	P01-A23-ICT1										
		P01-A23-EX03 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ · รอยืนยันขอบเขต														
งานตกแต่งภายในและนิทรรศการ						2 กิจกรรม										
01.2.3.37.01		งานติดตั้งนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้	119 วัน	D669	D787	P01-A23-ENV										
		P01-A23-EX01 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
01.2.3.37.02		งานบูรณาการเนื้อหานิทรรศการและระบบโสตทัศนูปกรณ์	93 วัน	D708	D800	P01-A23-ICT1										
		P01-A23-EX02 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.3.30		งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ	127 วัน	D655	D781	P01-A23-GB										
		P01-A23-EXT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.2.3.31		งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน	34 วัน	D774	D807	P01-A23-SAN(SS); P01-A23-ELE2(SS); P01-A23-HV2(SS); P01-A23-ICT2(SS)+49; P05-										
		P01-A23-PRECOM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
01.2.3.32		งานทดสอบการทำงานรายระบบ	7 วัน	D808	D814	P01-A23-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-A23-ETST(FF); P01-A23-PTST(FF); P01-A-										
		P01-A23-FUNC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
01.2.3.33		งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ	13 วัน	D815	D827	P01-A23-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)										
		P01-A23-COMM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.2.3.34		งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข	9 วัน	D828	D836	P01-A23-COMM										
		P01-A23-SNAG · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
01.2.3.35		งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ	4 วัน	D837	D840	P01-A23-SNAG										
		P01-A23-CORR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.3.36		งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน	64 วัน	D774	D837	P01-A23-FRM										
		P01-A23-ASB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.3.99		จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่	จุด	D840	D840	P01-A23-CORR; P01-A23-ASB; P01-A23-COMM; P01-A23-ENV; P01-A23-DRW-										
		P01-A23-HO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ														
อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ						44 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.4.01		จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง	จุด	D300	D300	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R-										
		P01-A24-REL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ														
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.2.4.02		งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง	17 วัน	D300	D316	P01-A24-REL										
		P01-A24-SUR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ														
01.2.4.03		งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น	42 วัน	D314	D355	P01-A24-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(SS); P08-A24-EARTH-PTW; P10-A24-EARTH-ENV										
		P01-A24-EXC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ														
01.2.4.04		งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน	22 วัน	D348	D369	P01-A24-EXC(SS)+32										
		P01-A24-BLI · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ														

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · งานโครงสร้าง

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานโครงสร้าง (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.2.4.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A24-RBF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24 วัน	D371	D394	P01-A24-BLI; P06-STR-10; P11-A24-STR-DOC											
01.2.4.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A24-FMF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24 วัน	D374	D397	P01-A24-BLI; P11-A24-STR-DOC											
01.2.4.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A24-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D397	D397	P01-A24-RBF; P01-A24-FMF											
01.2.4.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ป้ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A24-FND · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	26 วัน	D397	D422	P01-A24-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A24-GB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51 วัน	D413	D463	P01-A24-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A24-FRM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89 วัน	D447	D535	P01-A24-GB(SS)+18; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A24-ROOF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54 วัน	D509	D562	P01-A24-FRM(SS)+32; P05-PLT-STR(SS); P08-A24-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.2.4.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A24-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54 วัน	D546	D599	P01-A24-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P11-A24-ARC-DOC											
01.2.4.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-A24-EWALL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89 วัน	D516	D604	P01-A24-FRM(SS)+37; P06-ARC-10; P11-A24-ARC-DOC											
01.2.4.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A24-PART · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	81 วัน	D537	D617	P01-A24-FRM(SS)+46; P11-A24-ARC-DOC											
01.2.4.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A24-WFIN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	68 วัน	D599	D666	P01-A24-PART(SS)+60; P01-A24-MEP1(SS)+14											
01.2.4.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A24-DRW · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	75 วัน	D601	D675	P01-A24-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.4.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับบนฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A24-CEIL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	59 วัน	D631	D689	P01-A24-MEP1(SS)+46; P07-A24-CEIL-HOLD											
01.2.4.23	งานตกแต่งฝัพื้น P01-A24-FLR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	63 วัน	D629	D691	P01-A24-WFIN(SS)											
01.2.4.24	งานทาสีและเก็บฝัสถปัตยกรรม P01-A24-PNT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	52 วัน	D663	D714	P01-A24-WFIN(SS)+18; P01-A24-CEIL(SS)											
01.2.4.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A24-SAN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	50 วัน	D670	D719	P01-A24-PLB1; P01-A24-WFIN(SS)											
01.2.4.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A24-FURN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51 วัน	D680	D730	P01-A24-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.2.4.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A24-MEP1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	105 วัน	D525	D629	P01-A24-FRM(SS)+37; P05-PLT-MEP(SS); P11-A24-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.2.4.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A24-ELE1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	95 วัน	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A24-MEP-DOC											
01.2.4.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A24-ELE2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	52 วัน	D670	D721	P01-A24-ELE1; P01-A24-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.4.32.T05	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-ETST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5 วัน	D738	D742	P01-A24-PRECOM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.2.4.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A24-PLB1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	95 วัน	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A24-MEP-DOC											
01.2.4.32.T06	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-PTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5 วัน	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						3 กิจกรรม										
01.2.4.18	งานท้อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A24-HV1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	95 วัน	D537	D631	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A24-MEP-DOC											
01.2.4.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A24-HV2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	54 วัน	D673	D726	P01-A24-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.4.32.T07	งานทดสอบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบควบคุม — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-HTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5 วัน	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.2.4.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A24-ICT1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	81 วัน	D558	D638	P01-A24-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A24-MEP-DOC											
01.2.4.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A24-ICT2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · รอยืนยันขอบเขต	51 วัน	D680	D730	P01-A24-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบครัว						2 กิจกรรม										
01.2.4.32.T08	งานทดสอบครุภัณฑ์และระบบครัว — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-KTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5 วัน	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.37.01	งานเชื่อมต่อระบบดูดควัน เต็มอากาศ และระบายน้ำมันจากครัว P01-A24-EX01 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	120 วัน	D567	D686	P01-A24-MEP1(SS)+42											
งานครุภัณฑ์						1 กิจกรรม										
01.2.4.37.02	งานติดตั้งครุภัณฑ์ครัว P01-A24-EX02 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	61 วัน	D668	D728	P01-A24-ENV											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.4.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A24-EXT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89 วัน	D631	D719	P01-A24-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						4 กิจกรรม										
01.2.4.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจจนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A24-PRECOM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24 วัน	D714	D737	P01-A24-SAN(SS); P01-A24-ELE2(SS); P01-A24-HV2(SS); P01-A24-ICT2(SS); P05-PL...											
01.2.4.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-A24-FUNC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5 วัน	D738	D742	P01-A24-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-A24-ETST(FF); P01-A24-PTST(FF); P01-A...											
01.2.4.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A24-COMM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	9 วัน	D743	D751	P01-A24-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.4.37.03	งานทดสอบการทำงานและสุขลักษณะระบบครัว P01-A24-EX03 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	18 วัน	D738	D755	P01-A24-PRECOM											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.2.4.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A24-SNAG · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	6 วัน	D751	D756	P01-A24-COMM(SS)											
01.2.4.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A24-CORR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	3 วัน	D757	D759	P01-A24-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.4.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A24-ASB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	45 วัน	D714	D758	P01-A24-FRM											

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										I
01.2.4.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A24-HO · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D760	D760	P01-A24-CORR; P01-A24-ASB; P01-A24-COMM; P01-A24-ENV; P01-A24-DRW...							◆				
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						41 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										I
01.2.5.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A25-REL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D330	D330	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...			◆								
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.2.5.02	งานปรับบริเวณ ส้วม และปักผัง P01-A25-SUR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	17 วัน	D330	D346	P01-A25-REL			■								
01.2.5.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A25-EXC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	43 วัน	D344	D386	P01-A25-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(SS); P08-A25-EARTH-PTW; P10-A25-EARTH-ENV			■								
01.2.5.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A25-BLI · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	23 วัน	D379	D401	P01-A25-EXC(SS)+33				■							
01.2.5.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A25-RBF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	24 วัน	D403	D426	P01-A25-BLI; P06-STR-10; P11-A25-STR-DOC				■							
01.2.5.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A25-FMF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	25 วัน	D405	D429	P01-A25-BLI; P11-A25-STR-DOC				■							
01.2.5.07	จุดพักรอก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A25-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D429	D429	P01-A25-RBF; P01-A25-FMF				◆							
01.2.5.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปุ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A25-FND · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	27 วัน	D429	D455	P01-A25-HOLD; P05-PLT-STR(SS)				■							
01.2.5.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A25-GB · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53 วัน	D445	D497	P01-A25-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)					■						
01.2.5.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A25-FRM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	91 วัน	D480	D570	P01-A25-GB(SS)+19; P05-PLT-STR(SS)						■					
01.2.5.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A25-ROOF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	55 วัน	D544	D598	P01-A25-FRM(SS)+33; P05-PLT-STR(SS); P08-A25-WAH						■					
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.2.5.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A25-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	56 วัน	D581	D636	P01-A25-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P11-A25-ARC-DOC						■					
01.2.5.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-A25-EWALL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	90 วัน	D551	D640	P01-A25-FRM(SS)+38; P06-ARC-10; P11-A25-ARC-DOC						■					
01.2.5.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A25-PART · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83 วัน	D572	D654	P01-A25-FRM(SS)+47; P11-A25-ARC-DOC						■					
01.2.5.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A25-WFIN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	69 วัน	D636	D704	P01-A25-PART(SS)+61; P01-A25-MEP1(SS)+14							■				
01.2.5.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A25-DRW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	76 วัน	D638	D713	P01-A25-EWALL(SS); P06-ARC-10							■				
01.2.5.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A25-Ceil · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	60 วัน	D668	D727	P01-A25-MEP1(SS)+47; P07-A25-Ceil-HOLD							■				
01.2.5.23	งานตกแต่งฝัผนัง P01-A25-FLR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	65 วัน	D666	D730	P01-A25-WFIN(SS)							■				
01.2.5.24	งานทาสีและเก็บฝัผนังสถาปัตยกรรม P01-A25-PNT · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53 วัน	D701	D753	P01-A25-WFIN(SS)+19; P01-A25-Ceil(SS)							■				
01.2.5.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A25-SAN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	51 วัน	D708	D758	P01-A25-PLB1; P01-A25-WFIN(SS)							■				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.2.5.29	งานเฟอร์นิเจอร์บริเวณที่อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A25-FURN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52 วัน	D718	D769	P01-A25-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.2.5.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A25-MEP1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	107 วัน	D560	D666	P01-A25-FRM(SS)+38; P05-PLT-MEP(SS); P11-A25-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.2.5.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A25-ELE1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	97 วัน	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A25-MEP-DOC											
01.2.5.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A25-ELE2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53 วัน	D708	D760	P01-A25-ELE1; P01-A25-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.5.32.T09	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P01-A25-ETST · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4 วัน	D778	D781	P01-A25-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						1 กิจกรรม										
01.2.5.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A25-PLB1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	97 วัน	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A25-MEP-DOC											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.2.5.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A25-HV1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	97 วัน	D572	D668	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A25-MEP-DOC											
01.2.5.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A25-HV2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	55 วัน	D711	D765	P01-A25-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						4 กิจกรรม										
01.2.5.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร ก่อสร้างวงจรปิด เครือข่าย และใส่ทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A25-ICT1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83 วัน	D593	D675	P01-A25-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A25-MEP-DOC											
01.2.5.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ก่อสร้างวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A25-ICT2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52 วัน	D718	D769	P01-A25-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.5.32.T10	งานทดสอบระบบสื่อสาร ก่อสร้างวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุม — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P01-A25-ITST · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4 วัน	D778	D781	P01-A25-PRECOM											
01.2.5.37.01	งานติดตั้งระบบใส่ทัศนูปกรณ์ เสียง และระบบควบคุมห้องประชุม P01-A25-EX01 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	71 วัน	D697	D767	P01-A25-ICT1											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.5.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A25-EXT · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	91 วัน	D668	D758	P01-A25-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						4 กิจกรรม										
01.2.5.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A25-PRECOM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	25 วัน	D753	D777	P01-A25-SAN(SS); P01-A25-ELE2(SS); P01-A25-HV2(SS); P01-A25-ICT2(SS); P05-PL...											
01.2.5.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-A25-FUNC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4 วัน	D778	D781	P01-A25-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-A25-ETST(FF); P01-A25-ITST(FF)											
01.2.5.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A25-COMM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	10 วัน	D782	D791	P01-A25-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.5.37.02	งานทดสอบระบบเสียง อะคูสติก และใส่ทัศนูปกรณ์ P01-A25-EX02 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	15 วัน	D778	D792	P01-A25-PRECOM											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.2.5.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A25-SNAG · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	6 วัน	D791	D796	P01-A25-COMM(SS)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง (ต่อ)						2 กิจกรรม										
01.2.5.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A25-CORR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	3 วัน	D797	D799	P01-A25-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.5.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A25-ASB · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	46 วัน	D753	D798	P01-A25-FRM											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.5.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A25-HO · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D800	D800	P01-A25-CORR; P01-A25-ASB; P01-A25-COMM; P01-A25-ENV; P01-A25-DRW...											
อาคารผลิตน้ำประปา						42 กิจกรรม										
งานบริหารและควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.6.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A26-REL · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D360	D360	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.2.6.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-A26-SUR · อาคารผลิตน้ำประปา	16 วัน	D360	D375	P01-A26-REL											
01.2.6.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A26-EXC · อาคารผลิตน้ำประปา	40 วัน	D373	D412	P01-A26-SUR(SS)+13; P05-PLT-EARTH(SS); P08-A26-EARTH-PTW; P10-A26-EARTH-ENV											
01.2.6.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A26-BLI · อาคารผลิตน้ำประปา	21 วัน	D405	D425	P01-A26-EXC(SS)+30											
01.2.6.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A26-RBF · อาคารผลิตน้ำประปา	22 วัน	D427	D448	P01-A26-BLI; P06-STR-10; P11-A26-STR-DOC											
01.2.6.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A26-FMF · อาคารผลิตน้ำประปา	22 วัน	D429	D450	P01-A26-BLI; P11-A26-STR-DOC											
01.2.6.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A26-HOLD · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D450	D450	P01-A26-RBF; P01-A26-FMF											
01.2.6.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A26-FND · อาคารผลิตน้ำประปา	25 วัน	D450	D474	P01-A26-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A26-GB · อาคารผลิตน้ำประปา	49 วัน	D465	D513	P01-A26-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A26-FRM · อาคารผลิตน้ำประปา	82 วัน	D498	D579	P01-A26-GB(SS)+17; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A26-ROOF · อาคารผลิตน้ำประปา	50 วัน	D556	D605	P01-A26-FRM(SS)+30; P05-PLT-STR(SS); P08-A26-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.2.6.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A26-ENV · อาคารผลิตน้ำประปา	51 วัน	D590	D640	P01-A26-ROOF(SS)+13; P06-ARC-10; P11-A26-ARC-DOC											
01.2.6.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-A26-EWALL · อาคารผลิตน้ำประปา	83 วัน	D562	D644	P01-A26-FRM(SS)+34; P06-ARC-10; P11-A26-ARC-DOC											
01.2.6.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A26-PART · อาคารผลิตน้ำประปา	77 วัน	D581	D657	P01-A26-FRM(SS)+43; P11-A26-ARC-DOC											
01.2.6.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A26-WFIN · อาคารผลิตน้ำประปา	63 วัน	D640	D702	P01-A26-PART(SS)+56; P01-A26-MEP1(SS)+13											
01.2.6.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A26-DRW · อาคารผลิตน้ำประปา	69 วัน	D642	D710	P01-A26-EWALL(SS); P06-ARC-10											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.2.6.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A26-CEIL · อาคารผลิตน้ำประปา	54 วัน	D670	D723	P01-A26-MEP1(SS)+43; P07-A26-CEIL-HOLD											
01.2.6.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A26-FLR · อาคารผลิตน้ำประปา	60 วัน	D667	D726	P01-A26-WFIN(SS)											
01.2.6.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A26-PNT · อาคารผลิตน้ำประปา	48 วัน	D700	D747	P01-A26-WFIN(SS)+17; P01-A26-CEIL(SS)											
01.2.6.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A26-SAN · อาคารผลิตน้ำประปา · รอยืนยันขอบเขต	46 วัน	D706	D751	P01-A26-PLB1; P01-A26-WFIN(SS)											
01.2.6.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A26-FURN · อาคารผลิตน้ำประปา	48 วัน	D715	D762	P01-A26-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.2.6.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A26-MEP1 · อาคารผลิตน้ำประปา	97 วัน	D571	D667	P01-A26-FRM(SS)+34; P05-PLT-MEP(SS); P11-A26-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						2 กิจกรรม										
01.2.6.16	งานต่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-A26-ELE1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89 วัน	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A26-MEP-DOC											
01.2.6.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A26-ELE2 · อาคารผลิตน้ำประปา	48 วัน	D706	D753	P01-A26-ELE1; P01-A26-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						1 กิจกรรม										
01.2.6.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A26-PLB1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89 วัน	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A26-MEP-DOC											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.2.6.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A26-HV1 · อาคารผลิตน้ำประปา · รอยืนยันขอบเขต	90 วัน	D581	D670	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A26-MEP-DOC											
01.2.6.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A26-HV2 · อาคารผลิตน้ำประปา · รอยืนยันขอบเขต	51 วัน	D708	D758	P01-A26-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.2.6.19	งานต่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A26-ICT1 · อาคารผลิตน้ำประปา · รอยืนยันขอบเขต	76 วัน	D601	D676	P01-A26-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A26-MEP-DOC											
01.2.6.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A26-ICT2 · อาคารผลิตน้ำประปา · รอยืนยันขอบเขต	48 วัน	D715	D762	P01-A26-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบผลิตน้ำ						2 กิจกรรม										
01.2.6.32.T11	งานทดสอบระบบน้ำ ระบบสูบน้ำ และกระบวนการ — อาคารผลิตน้ำประปา P01-A26-WTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4 วัน	D770	D773	P01-A26-PRECOM											
01.2.6.37.01	งานติดตั้งบ่มีم ถึง และวาล์วระบบผลิตน้ำประปา P01-A26-EX01 · อาคารผลิตน้ำประปา	112 วัน	D627	D738	P01-A26-MEP1(SS)+56											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.6.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A26-EXT · อาคารผลิตน้ำประปา	82 วัน	D670	D751	P01-A26-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						4 กิจกรรม										
01.2.6.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A26-PRECOM · อาคารผลิตน้ำประปา	23 วัน	D747	D769	P01-A26-SAN(SS); P01-A26-ELE2(SS); P01-A26-HV2(SS); P01-A26-ICT2(SS); P05-PL...											
01.2.6.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-A26-FUNC · อาคารผลิตน้ำประปา	4 วัน	D770	D773	P01-A26-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-A26-WTST(FF); P01-A26-CTST(FF)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานทดสอบและเดินระบบ (ต่อ)						4 กิจกรรม										
01.2.6.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A26-COMM · อาคารผลิตน้ำประปา	8 วัน	D774	D781	P01-A26-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.6.37.03	งานล้างระบบและทดสอบการทำงานระบบผลิตน้ำประปา P01-A26-EX03 · อาคารผลิตน้ำประปา	16 วัน	D770	D785	P01-A26-PRECOM											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.2.6.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A26-SNAG · อาคารผลิตน้ำประปา	6 วัน	D781	D786	P01-A26-COMM(SS)											
01.2.6.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A26-CORR · อาคารผลิตน้ำประปา	3 วัน	D787	D789	P01-A26-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.6.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A26-ASB · อาคารผลิตน้ำประปา	42 วัน	D747	D788	P01-A26-FRM											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.6.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A26-HO · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D790	D790	P01-A26-CORR; P01-A26-ASB; P01-A26-COMM; P01-A26-ENV; P01-A26-DRW...											
งานไฟฟ้าและระบบควบคุม						2 กิจกรรม										
01.2.6.32.T12	งานทดสอบไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือวัด และระบบควบคุม — อาคารผลิตน้ำประปา P01-A26-CTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4 วัน	D770	D773	P01-A26-PRECOM											
01.2.6.37.02	งานติดตั้งเครื่องมือวัด ตู้ควบคุม และเซนเซอร์ P01-A26-EX02 · อาคารผลิตน้ำประปา	82 วัน	D670	D751	P01-A26-ELE1											
สนามหญ้าอ่อนกประสงค์						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.7.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A27-REL · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	จุด	D520	D520	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.2.7.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A27-SUR · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	19 วัน	D520	D538	P01-A27-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.2.7.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A27-EW · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	61 วัน	D544	D604	P01-A27-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-A27-CIV-DOC; P08-A27-EARTH-PTW; P1...											
01.2.7.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A27-BASE · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	79 วัน	D610	D688	P01-A27-DRN(SS); P11-A27-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.2.7.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-A27-ELE · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์ · รอยืนยันขอบเขต	79 วัน	D670	D748	P01-A27-UTIL(SS); P11-A27-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.2.7.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-A27-PAVE · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	73 วัน	D664	D736	P01-A27-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-A27-LAND-DOC											
01.2.7.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A27-FURN · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	58 วัน	D715	D772	P01-A27-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.2.7.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A27-SOIL · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	61 วัน	D694	D754	P01-A27-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A27-LAND-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานภูมิทัศน์ (ต่อ)						3 กิจกรรม										
01.2.7.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-A27-SOFT · สนามหญ้าอเนกประสงค์	55 วัน	D736	D790	P01-A27-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-A27-LAND-DOC											
01.2.7.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A27-IRR · สนามหญ้าอเนกประสงค์	67 วัน	D736	D802	P01-A27-UTIL; P01-A27-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P11-A27-LAND-DOC											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.2.7.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A27-DRN · สนามหญ้าอเนกประสงค์	82 วัน	D565	D646	P01-A27-EW(SS)*15; P11-A27-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.7.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A27-UTIL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	91 วัน	D586	D676	P01-A27-EW(SS)*24; P06-STR-10; P11-A27-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล่อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.2.7.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A27-MON · สนามหญ้าอเนกประสงค์	274 วัน	D535	D808	P01-A27-CTRL(SS)											
01.2.7.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A27-REST · สนามหญ้าอเนกประสงค์	31 วัน	D784	D814	P01-A27-SOFT(SS); P01-A27-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.2.7.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A27-FIN · สนามหญ้าอเนกประสงค์	12 วัน	D808	D819	P01-A27-REST(SS); P01-A27-ELE; P01-A27-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.7.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A27-HO · สนามหญ้าอเนกประสงค์	จุด	D820	D820	P01-A27-FIN; P01-A27-FURN; P01-A27-MON											
งานสิ่งแวดล่อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.2.7.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A27-CTRL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	28 วัน	D529	D556	P01-A27-SUR(SS)											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.8.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A28-REL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D650	D650	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.2.8.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A28-SUR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	21 วัน	D650	D670	P01-A28-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.2.8.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A28-EW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67 วัน	D676	D742	P01-A28-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-A28-CIV-DOC; P08-A28-EARTH-PTW; P1...											
01.2.8.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A28-BASE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	87 วัน	D749	D835	P01-A28-DRN(SS); P11-A28-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.2.8.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า	87 วัน	D815	D901	P01-A28-UTIL(SS); P11-A28-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.2.8.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-A28-PAVE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	81 วัน	D808	D888	P01-A28-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-A28-LAND-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก (ต่อ)						2 กิจกรรม										
01.2.8.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A28-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	63 วัน	D865	D927	P01-A28-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.2.8.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A28-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67 วัน	D841	D907	P01-A28-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A28-LAND-DOC											
01.2.8.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-A28-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	60 วัน	D888	D947	P01-A28-SOIL(SS); P08-LAND-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-A28-LAND-DOC											
01.2.8.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A28-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	73 วัน	D888	D960	P01-A28-UTIL; P01-A28-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P11-A28-LAND-DOC											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.2.8.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A28-DRN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	90 วัน	D700	D789	P01-A28-EW(SS)+17; P11-A28-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.8.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A28-UTIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	100 วัน	D723	D822	P01-A28-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-A28-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.2.8.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A28-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	301 วัน	D667	D967	P01-A28-CTRL(SS)											
01.2.8.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A28-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	34 วัน	D940	D973	P01-A28-SOFT(SS); P01-A28-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.2.8.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A28-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	13 วัน	D967	D979	P01-A28-REST(SS); P01-A28-ELE; P01-A28-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.8.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A28-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D980	D980	P01-A28-FIN; P01-A28-FURN; P01-A28-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.2.8.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A28-CTRL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	31 วัน	D660	D690	P01-A28-SUR(SS)											
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A						39 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.2.9.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A29-REL · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	จุด	D620	D620	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P01-PRE-R_											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.2.9.02	งานปรับบริเวณ ส้วม และบักผั่ง P01-A29-SUR · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	9 วัน	D620	D628	P01-A29-REL											
01.2.9.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A29-EXC · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	20 วัน	D627	D646	P01-A29-SUR(SS)+7; P05-PLT-EARTH(SS); P08-A29-EARTH-PTW; P10-A29-EARTH-ENV											
01.2.9.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A29-BLI · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	11 วัน	D643	D653	P01-A29-EXC(SS)+15											
01.2.9.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A29-RBF · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	12 วัน	D654	D665	P01-A29-BLI; P06-STR-10; P11-A29-STR-DOC											
01.2.9.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A29-FMF · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	12 วัน	D655	D666	P01-A29-BLI; P11-A29-STR-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานโครงสร้าง (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.2.9.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A29-HOLD · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	จุด	D666	D666	P01-A29-RBF; P01-A29-FMF											
01.2.9.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปุ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A29-FND · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	13 วัน	D666	D678	P01-A29-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A29-GB · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25 วัน	D674	D698	P01-A29-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A29-FRM · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	43 วัน	D690	D732	P01-A29-GB(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A29-ROOF · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	26 วัน	D720	D745	P01-A29-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS); P08-A29-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.2.9.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A29-ENV · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	26 วัน	D738	D763	P01-A29-ROOF(SS)+7; P06-ARC-10; P11-A29-ARC-DOC											
01.2.9.13	งานผนังภายนอก ฝัวมผนัง และช่องเปิด P01-A29-EWALL · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	43 วัน	D723	D765	P01-A29-FRM(SS)+18; P06-ARC-10; P11-A29-ARC-DOC											
01.2.9.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A29-PART · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	40 วัน	D733	D772	P01-A29-FRM(SS)+22; P11-A29-ARC-DOC											
01.2.9.20	งานผนังและฝัวมผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A29-WFIN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	33 วัน	D763	D795	P01-A29-PART(SS)+29; P01-A29-MEP1(SS)+7											
01.2.9.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A29-DRW · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	36 วัน	D764	D799	P01-A29-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.9.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A29-CEIL · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	29 วัน	D778	D806	P01-A29-MEP1(SS)+22; P07-A29-CEIL-HOLD											
01.2.9.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A29-FLR · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	31 วัน	D777	D807	P01-A29-WFIN(SS)											
01.2.9.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A29-PNT · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25 วัน	D794	D818	P01-A29-WFIN(SS)+9; P01-A29-CEIL(SS)											
01.2.9.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A29-SAN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	24 วัน	D797	D820	P01-A29-PLB1; P01-A29-WFIN(SS)											
01.2.9.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A29-FURN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25 วัน	D802	D826	P01-A29-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.2.9.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A29-MEP1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	50 วัน	D728	D777	P01-A29-FRM(SS)+18; P05-PLT-MEP(SS); P11-A29-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.2.9.16	งานต่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A29-ELE1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	46 วัน	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A29-MEP-DOC											
01.2.9.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A29-ELE2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25 วัน	D797	D821	P01-A29-ELE1; P01-A29-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.9.32.T13	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P01-A29-ETST · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	2 วัน	D830	D831	P01-A29-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.2.9.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A29-PLB1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	46 วัน	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A29-MEP-DOC											
01.2.9.32.T14	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P01-A29-PTST · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A · รอยืนยันขอบเขต	2 วัน	D830	D831	P01-A29-PRECOM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.2.9.18	งานท่อมลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A29-HV1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	46 วัน	D733	D778	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A29-MEP-DOC											
01.2.9.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A29-HV2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	27 วัน	D798	D824	P01-A29-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.2.9.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A29-ICT1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	40 วัน	D743	D782	P01-A29-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-A29-MEP-DOC											
01.2.9.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A29-ICT2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25 วัน	D802	D826	P01-A29-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.2.9.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A29-EXT · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	43 วัน	D778	D820	P01-A29-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.2.9.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A29-PRECOM · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	12 วัน	D818	D829	P01-A29-SAN(SS); P01-A29-ELE2(SS); P01-A29-HV2(SS); P01-A29-ICT2(SS); P05-PL...											
01.2.9.32	งานทดสอบการทำงานรยระบบ P01-A29-FUNC · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	2 วัน	D830	D831	P01-A29-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-A29-ETST(FF); P01-A29-PTST(FF)											
01.2.9.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A29-COMM · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	4 วัน	D832	D835	P01-A29-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.2.9.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A29-SNAG · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	5 วัน	D832	D836	P01-A29-COMM(SS)											
01.2.9.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A29-CORR · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	3 วัน	D837	D839	P01-A29-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.9.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A29-ASB · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	22 วัน	D818	D839	P01-A29-FRM											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.2.9.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A29-HO · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	จุด	D840	D840	P01-A29-CORR; P01-A29-ASB; P01-A29-COMM; P01-A29-ENV; P01-A29-DRW...											
พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
จุดควบคุมรอบเวลาหลัก						1 กิจกรรม										
01.2.98	จุดควบคุม CP-05 งานสถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคาร พื้นที่ A แล้วเสร็จ P01-CP05-GATE · พื้นที่ A	จุด	D840	D840	P01-A23-HO; P01-A24-HO; P01-A25-HO; P01-A26-HO; P01-A29-HO											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						39 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.3.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B31-REL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-HSE-B-REL; P10-ENV-B-REL; P01-PRE-R...											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.3.1.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-B31-SUR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	10 วัน	D500	D509	P01-B31-REL											
01.3.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-B31-EXC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	24 วัน	D508	D531	P01-B31-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(SS); P08-B31-EARTH-PTW; P10-B31-EARTH-ENV											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานโครงสร้าง (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.3.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-B31-BLI · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	13 วัน	D527	D539	P01-B31-EXC(SS)+18											
01.3.1.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-B31-RBF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14 วัน	D540	D553	P01-B31-BLI; P06-STR-10; P11-B31-STR-DOC											
01.3.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-B31-FMF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14 วัน	D542	D555	P01-B31-BLI; P11-B31-STR-DOC											
01.3.1.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-B31-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D555	D555	P01-B31-RBF; P01-B31-FMF											
01.3.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-B31-FND · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	15 วัน	D555	D569	P01-B31-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-B31-GB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29 วัน	D564	D592	P01-B31-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-B31-FRM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51 วัน	D583	D633	P01-B31-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานหลักรูปพรรณ P01-B31-ROOF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31 วัน	D618	D648	P01-B31-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS); P08-B31-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.3.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-B31-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31 วัน	D639	D669	P01-B31-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-B31-ARC-DOC											
01.3.1.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-B31-EWALL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51 วัน	D622	D672	P01-B31-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11-B31-ARC-DOC											
01.3.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-B31-PART · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	46 วัน	D634	D679	P01-B31-FRM(SS)+26; P11-B31-ARC-DOC											
01.3.1.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-B31-WFIN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	39 วัน	D669	D707	P01-B31-PART(SS)+34; P01-B31-MEP1(SS)+8											
01.3.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-B31-DRW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	43 วัน	D670	D712	P01-B31-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.3.1.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับบนเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-B31-CEIL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	34 วัน	D687	D720	P01-B31-MEP1(SS)+26; P07-B31-CEIL-HOLD											
01.3.1.23	งานตกแต่งฝัผนัง P01-B31-FLR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	36 วัน	D686	D721	P01-B31-WFIN(SS)											
01.3.1.24	งานทาสีและเก็บฝัผนังสถาปัตยกรรม P01-B31-PNT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	30 วัน	D705	D734	P01-B31-WFIN(SS)+10; P01-B31-CEIL(SS)											
01.3.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-B31-SAN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29 วัน	D709	D737	P01-B31-PLB1; P01-B31-WFIN(SS)											
01.3.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-B31-FURN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29 วัน	D715	D743	P01-B31-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.3.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-B31-MEP1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	60 วัน	D627	D686	P01-B31-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(SS); P11-B31-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.3.1.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-B31-ELE1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	54 วัน	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B31-MEP-DOC											
01.3.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-B31-ELE2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	30 วัน	D709	D738	P01-B31-ELE1; P01-B31-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.3.1.32.T16	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P01-B31-ETST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D748	D750	P01-B31-PRECOM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม					[Bar]					
01.3.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-B31-PLB1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	54 วัน	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B31-MEP-DOC						[Bar]					
01.3.1.32.T15	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P01-B31-PTST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3 วัน	D748	D750	P01-B31-PRECOM							[Bar]				
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม					[Bar]					
01.3.1.18	งานท้อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-B31-HV1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	54 วัน	D634	D687	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B31-MEP-DOC						[Bar]					
01.3.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-B31-HV2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	31 วัน	D711	D741	P01-B31-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)							[Bar]				
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม					[Bar]					
01.3.1.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-B31-ICT1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	46 วัน	D646	D691	P01-B31-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B31-MEP-DOC						[Bar]					
01.3.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-B31-ICT2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	29 วัน	D715	D743	P01-B31-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)							[Bar]				
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม					[Bar]					
01.3.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-B31-EXT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51 วัน	D687	D737	P01-B31-GB						[Bar]					
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม						[Bar]				
01.3.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-B31-PRECOM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14 วัน	D734	D747	P01-B31-SAN(SS); P01-B31-ELE2(SS); P01-B31-HV2(SS); P01-B31-ICT2(SS); P05-PL...							[Bar]				
01.3.1.32	งานทดสอบการทำงานรายการระบบ P01-B31-FUNC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3 วัน	D748	D750	P01-B31-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-B31-PTST(FF); P01-B31-ETST(FF)							[Bar]				
01.3.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-B31-COMM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	5 วัน	D751	D755	P01-B31-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)							[Bar]				
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม						[Bar]				
01.3.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-B31-SNAG · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	6 วัน	D751	D756	P01-B31-COMM(SS)							[Bar]				
01.3.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-B31-CORR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3 วัน	D757	D759	P01-B31-SNAG							[Bar]				
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม						[Bar]				
01.3.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-B31-ASB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	26 วัน	D734	D759	P01-B31-FRM							[Bar]				
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม						[Bar]				
01.3.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-B31-HO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D760	D760	P01-B31-CORR; P01-B31-ASB; P01-B31-COMM; P01-B31-ENV; P01-B31-DRW...							[Diamond]				
อาคารขยะ พื้นที่ B						39 กิจกรรม				[Bar]						
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม					[Bar]					
01.3.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B32-REL · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D520	D520	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-HSE-B-REL; P10-ENV-B-REL; P01-PRE-R...					[Diamond]						
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม				[Bar]						
01.3.2.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-B32-SUR · อาคารขยะ พื้นที่ B	8 วัน	D520	D527	P01-B32-REL					[Bar]						
01.3.2.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-B32-EXC · อาคารขยะ พื้นที่ B	20 วัน	D526	D545	P01-B32-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(SS); P08-B32-EARTH-PTW; P10-B32-EARTH-ENV					[Bar]						

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานโครงสร้าง (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.3.2.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-B32-BLI · อาคารขยะ พื้นที่ B	11 วัน	D542	D552	P01-B32-EXC(SS)+15											
01.3.2.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-B32-RBF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11 วัน	D553	D563	P01-B32-BLI; P06-STR-10; P11-B32-STR-DOC											
01.3.2.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-B32-FMF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11 วัน	D554	D564	P01-B32-BLI; P11-B32-STR-DOC											
01.3.2.07	จุดพักรอตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-B32-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D564	D564	P01-B32-RBF; P01-B32-FMF											
01.3.2.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-B32-FND · อาคารขยะ พื้นที่ B	13 วัน	D564	D576	P01-B32-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-B32-GB · อาคารขยะ พื้นที่ B	25 วัน	D571	D595	P01-B32-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-B32-FRM · อาคารขยะ พื้นที่ B	41 วัน	D587	D627	P01-B32-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานหลักรูปพรรณ P01-B32-ROOF · อาคารขยะ พื้นที่ B	25 วัน	D616	D640	P01-B32-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS); P08-B32-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.3.2.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-B32-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	26 วัน	D632	D657	P01-B32-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11-B32-ARC-DOC											
01.3.2.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-B32-EWALL · อาคารขยะ พื้นที่ B	41 วัน	D619	D659	P01-B32-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11-B32-ARC-DOC											
01.3.2.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-B32-PART · อาคารขยะ พื้นที่ B	38 วัน	D628	D665	P01-B32-FRM(SS)+21; P11-B32-ARC-DOC											
01.3.2.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-B32-WFIN · อาคารขยะ พื้นที่ B	31 วัน	D657	D687	P01-B32-PART(SS)+27; P01-B32-MEP1(SS)+6											
01.3.2.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-B32-DRW · อาคารขยะ พื้นที่ B	34 วัน	D658	D691	P01-B32-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.3.2.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับบนเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-B32-CEIL · อาคารขยะ พื้นที่ B	27 วัน	D671	D697	P01-B32-MEP1(SS)+21; P07-B32-CEIL-HOLD											
01.3.2.23	งานตกแต่งฝัผนัง P01-B32-FLR · อาคารขยะ พื้นที่ B	30 วัน	D670	D699	P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.24	งานทาสีและเก็บฝัผนังสถาปัตยกรรม P01-B32-PNT · อาคารขยะ พื้นที่ B	24 วัน	D686	D709	P01-B32-WFIN(SS)+8; P01-B32-CEIL(SS)											
01.3.2.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-B32-SAN · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	23 วัน	D689	D711	P01-B32-PLB1; P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-B32-FURN · อาคารขยะ พื้นที่ B	24 วัน	D693	D716	P01-B32-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.3.2.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-B32-MEP1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	48 วัน	D623	D670	P01-B32-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS); P11-B32-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.3.2.16	งานต่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-B32-ELE1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	44 วัน	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B32-MEP-DOC											
01.3.2.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-B32-ELE2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	24 วัน	D689	D712	P01-B32-ELE1; P01-B32-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.3.2.32.T18	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารขยะ พื้นที่ B P01-B32-ETST · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	1 วัน	D721	D721	P01-B32-PRECOM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						1 กิจกรรม										
01.3.2.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-B32-PLB1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	44 วัน	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B32-MEP-DOC											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.3.2.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-B32-HV1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	44 วัน	D628	D671	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B32-MEP-DOC											
01.3.2.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-B32-HV2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	25 วัน	D690	D714	P01-B32-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.3.2.19	งานท่อและรางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และสวิตช์ศูนย์อุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-B32-ICT1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	37 วัน	D638	D674	P01-B32-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-B32-MEP-DOC											
01.3.2.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย สวิตช์ศูนย์อุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-B32-ICT2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	24 วัน	D693	D716	P01-B32-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบผลิตน้ำ						1 กิจกรรม										
01.3.2.32.T17	งานทดสอบระบบน้ำ ระบบสูบน้ำ และกระบวนการ — อาคารขยะ พื้นที่ B P01-B32-WTST · อาคารขยะ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	1 วัน	D721	D721	P01-B32-PRECOM											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.3.2.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-B32-EXT · อาคารขยะ พื้นที่ B	41 วัน	D671	D711	P01-B32-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.3.2.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-B32-PRECOM · อาคารขยะ พื้นที่ B	12 วัน	D709	D720	P01-B32-SAN(SS); P01-B32-ELE2(SS); P01-B32-HV2(SS); P01-B32-ICT2(SS); P05-PL...											
01.3.2.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-B32-FUNC · อาคารขยะ พื้นที่ B	1 วัน	D721	D721	P01-B32-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-B32-WTST(FF); P01-B32-ETST(FF)											
01.3.2.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-B32-COMM · อาคารขยะ พื้นที่ B	4 วัน	D722	D725	P01-B32-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.3.2.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-B32-SNAG · อาคารขยะ พื้นที่ B	5 วัน	D722	D726	P01-B32-COMM(SS)											
01.3.2.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-B32-CORR · อาคารขยะ พื้นที่ B	3 วัน	D727	D729	P01-B32-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.3.2.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-B32-ASB · อาคารขยะ พื้นที่ B	21 วัน	D709	D729	P01-B32-FRM											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.3.2.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-B32-HO · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D730	D730	P01-B32-CORR; P01-B32-ASB; P01-B32-COMM; P01-B32-ENV; P01-B32-DRW...											
ลานจอดรถ พื้นที่ B						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.3.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B33-REL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-HSE-B-REL; P10-ENV-B-REL; P01-PRE-R...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.3.3.02	งานสำรวจ บักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-B33-SUR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	21 วัน	D500	D520	P01-B33-REL											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.3.3.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-B33-EW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67 วัน	D526	D592	P01-B33-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-B33-CIV-DOC; P08-B33-EARTH-PTW; P1...											
01.3.3.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-B33-BASE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87 วัน	D599	D685	P01-B33-DRN(SS); P11-B33-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.3.3.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้าัย P01-B33-ELE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87 วัน	D665	D751	P01-B33-UTIL(SS); P11-B33-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.3.3.08	งานผิวทาง ทางเดิน ดันขอบ และภูมิทัศน์คาดแข็ง P01-B33-PAVE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	81 วัน	D658	D738	P01-B33-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-B33-LAND-DOC											
01.3.3.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-B33-FURN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	63 วัน	D715	D777	P01-B33-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.3.3.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-B33-SOIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67 วัน	D691	D757	P01-B33-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B33-LAND-DOC											
01.3.3.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกพื้นพื้พื้นที่ P01-B33-SOFT · ลานจอดรถ พื้นที่ B	60 วัน	D738	D797	P01-B33-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-B33-LAND-DOC											
01.3.3.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-B33-IRR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	73 วัน	D738	D810	P01-B33-UTIL; P01-B33-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P11-B33-LAND-DOC											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.3.3.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-B33-DRN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	90 วัน	D550	D639	P01-B33-EW(SS)+17; P11-B33-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.3.3.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-B33-UTIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	100 วัน	D573	D672	P01-B33-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-B33-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและพื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.3.3.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-B33-MON · ลานจอดรถ พื้นที่ B	301 วัน	D517	D817	P01-B33-CTRL(SS)											
01.3.3.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และพื้นฟูพื้นที่ P01-B33-REST · ลานจอดรถ พื้นที่ B	34 วัน	D790	D823	P01-B33-SOFT(SS); P01-B33-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.3.3.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-B33-FIN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	13 วัน	D817	D829	P01-B33-REST(SS); P01-B33-ELE; P01-B33-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.3.3.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-B33-HO · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D830	D830	P01-B33-FIN; P01-B33-FURN; P01-B33-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.3.3.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-B33-CTRL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	31 วัน	D510	D540	P01-B33-SUR(SS)											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจตุควบคุม						1 กิจกรรม										
01.3.4.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B34-REL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D720	D720	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-HSE-B-REL; P10-ENV-B-REL; P01-PRE-R...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.3.4.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-B34-SUR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	12 วัน	D720	D731	P01-B34-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.3.4.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-B34-EW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37 วัน	D734	D770	P01-B34-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P11-B34-CIV-DOC; P08-B34-EARTH-PTW; P1...											
01.3.4.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-B34-BASE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	48 วัน	D774	D821	P01-B34-DRN(SS); P11-B34-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.3.4.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-B34-ELE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	48 วัน	D810	D857	P01-B34-UTIL(SS); P11-B34-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.3.4.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดเชิง P01-B34-PAVE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	45 วัน	D806	D850	P01-B34-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-B34-LAND-DOC											
01.3.4.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-B34-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	35 วัน	D837	D871	P01-B34-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.3.4.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-B34-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37 วัน	D824	D860	P01-B34-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B34-LAND-DOC											
01.3.4.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกพื้นฟูพื้นที่ P01-B34-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	33 วัน	D850	D882	P01-B34-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-PLT-LAND(SS); P11-B34-LAND-DOC											
01.3.4.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-B34-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	40 วัน	D850	D889	P01-B34-UTIL; P01-B34-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P11-B34-LAND-DOC											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.3.4.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-B34-DRN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	50 วัน	D747	D796	P01-B34-EW(SS)*9; P11-B34-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.3.4.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-B34-UTIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · รอยืนยันขอบเขต	55 วัน	D760	D814	P01-B34-EW(SS)*14; P06-STR-10; P11-B34-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.3.4.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-B34-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	165 วัน	D729	D893	P01-B34-CTRL(SS)											
01.3.4.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-B34-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	19 วัน	D878	D896	P01-B34-SOFT(SS); P01-B34-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.3.4.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-B34-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	7 วัน	D893	D899	P01-B34-REST(SS); P01-B34-ELE; P01-B34-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.3.4.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-B34-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D900	D900	P01-B34-FIN; P01-B34-FURN; P01-B34-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.3.4.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-B34-CTRL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	18 วัน	D725	D742	P01-B34-SUR(SS)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						40 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.4.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C41-REL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P01-PRE-R_					◆						
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.4.1.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-C41-SUR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	11 วัน	D520	D530	P01-C41-REL					■						
01.4.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C41-EXC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	27 วัน	D528	D554	P01-C41-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(SS); P08-C41-EARTH-PTW; P10-C41-EARTH-ENV					■						
01.4.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C41-BLI · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	14 วัน	D549	D562	P01-C41-EXC(SS)+20					■						
01.4.1.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C41-RBF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15 วัน	D563	D577	P01-C41-BLI; P06-STR-10; P11-C41-STR-DOC					■						
01.4.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C41-FMF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15 วัน	D565	D579	P01-C41-BLI; P11-C41-STR-DOC					■						
01.4.1.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C41-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D579	D579	P01-C41-RBF; P01-C41-FMF					◆						
01.4.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C41-FND · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	16 วัน	D579	D594	P01-C41-HOLD; P05-PLT-STR(SS)					■						
01.4.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C41-GB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31 วัน	D589	D619	P01-C41-FND(SS)+6; P05-PLT-STR(SS)					■						
01.4.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C41-FRM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54 วัน	D610	D663	P01-C41-GB(SS)+11; P05-PLT-STR(SS)						■					
01.4.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C41-ROOF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	34 วัน	D647	D680	P01-C41-FRM(SS)+20; P05-PLT-STR(SS); P08-C41-WAH						■					
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.4.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C41-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33 วัน	D670	D702	P01-C41-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-C41-ARC-DOC						■					
01.4.1.13	งานผนังภายนอก ผนังกั้น และช่องเปิด P01-C41-EWALL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54 วัน	D652	D705	P01-C41-FRM(SS)+22; P06-ARC-10; P11-C41-ARC-DOC						■					
01.4.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C41-PART · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50 วัน	D664	D713	P01-C41-FRM(SS)+28; P11-C41-ARC-DOC						■					
01.4.1.20	งานผนังและผนังกั้น งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C41-WFIN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	42 วัน	D702	D743	P01-C41-PART(SS)+36; P01-C41-MEP1(SS)+8						■					
01.4.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระฉาก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C41-DRW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	46 วัน	D703	D748	P01-C41-EWALL(SS); P06-ARC-10						■					
01.4.1.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C41-CEIL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	36 วัน	D722	D757	P01-C41-MEP1(SS)+28; P07-C41-CEIL-HOLD						■					
01.4.1.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C41-FLR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	39 วัน	D720	D758	P01-C41-WFIN(SS)						■					
01.4.1.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C41-PNT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32 วัน	D741	D772	P01-C41-WFIN(SS)+11; P01-C41-CEIL(SS)						■					
01.4.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C41-SAN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31 วัน	D745	D775	P01-C41-PLB1; P01-C41-WFIN(SS)						■					
01.4.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C41-FURN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32 วัน	D751	D782	P01-C41-PNT(SS)						■					

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.4.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C41-MEP1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	64 วัน	D657	D720	P01-C41-FRM(SS)+Z2; P05-PLT-MEP(SS); P11-C41-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.4.1.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-C41-ELE1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58 วัน	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C41-MEP-DOC											
01.4.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C41-ELE2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32 วัน	D745	D776	P01-C41-ELE1; P01-C41-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.1.32.T19	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P01-C41-ETST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3 วัน	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.4.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C41-PLB1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58 วัน	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C41-MEP-DOC											
01.4.1.32.T20	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P01-C41-PTST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.4.1.18	งานท่อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C41-HV1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	59 วัน	D664	D722	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C41-MEP-DOC											
01.4.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C41-HV2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33 วัน	D747	D779	P01-C41-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						3 กิจกรรม										
01.4.1.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C41-ICT1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50 วัน	D677	D726	P01-C41-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C41-MEP-DOC											
01.4.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C41-ICT2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32 วัน	D751	D782	P01-C41-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.1.32.T21	งานทดสอบระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุม — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P01-C41-ITST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.4.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C41-EXT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54 วัน	D722	D775	P01-C41-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.4.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจจนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C41-PRECOM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15 วัน	D772	D786	P01-C41-SAN(SS); P01-C41-ELE2(SS); P01-C41-HV2(SS); P01-C41-ICT2(SS); P05-PL...											
01.4.1.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C41-FUNC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3 วัน	D787	D789	P01-C41-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-C41-ETST(FF); P01-C41-PTST(FF); P01-C...											
01.4.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C41-COMM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	5 วัน	D790	D794	P01-C41-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.4.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C41-SNAG · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	6 วัน	D791	D796	P01-C41-COMM(SS)											
01.4.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C41-CORR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3 วัน	D797	D799	P01-C41-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C41-ASB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	28 วัน	D772	D799	P01-C41-FRM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C41-HO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D800	D800	P01-C41-CORR; P01-C41-ASB; P01-C41-COMM; P01-C41-ENV; P01-C41-DR...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						39 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.4.2.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42A-REL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P01-PRE-R...											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.4.2.1.02	งานปรับบริเวณ ส้วม และปักผัง P01-C42A-SUR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	10 วัน	D520	D529	P01-C42A-REL											
01.4.2.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42A-EXC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	24 วัน	D528	D551	P01-C42A-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(SS); P08-C42A-EARTH-PTW; P10-C42A-EARTH-EN...											
01.4.2.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42A-BLI · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	13 วัน	D547	D559	P01-C42A-EXC(SS)+18											
01.4.2.1.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C42A-RBF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	14 วัน	D560	D573	P01-C42A-BLI; P06-STR-10; P11-C42A-STR-DOC											
01.4.2.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C42A-FMF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	14 วัน	D562	D575	P01-C42A-BLI; P11-C42A-STR-DOC											
01.4.2.1.07	จุดพักรอตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42A-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D575	D575	P01-C42A-RBF; P01-C42A-FMF											
01.4.2.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปุ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42A-FND · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	15 วัน	D575	D589	P01-C42A-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C42A-GB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	29 วัน	D584	D612	P01-C42A-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42A-FRM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	51 วัน	D603	D653	P01-C42A-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กโครงพรรณ P01-C42A-ROOF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	31 วัน	D638	D668	P01-C42A-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS); P08-C42A-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.4.2.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C42A-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	31 วัน	D659	D689	P01-C42A-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-C42A-ARC-DOC											
01.4.2.1.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-C42A-EWALL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	51 วัน	D642	D692	P01-C42A-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11-C42A-ARC-DOC											
01.4.2.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42A-PART · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	46 วัน	D654	D699	P01-C42A-FRM(SS)+26; P11-C42A-ARC-DOC											
01.4.2.1.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42A-WFIN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	39 วัน	D689	D727	P01-C42A-PART(SS)+34; P01-C42A-MEP1(SS)+8											
01.4.2.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระฉก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42A-DRW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	43 วัน	D690	D732	P01-C42A-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.2.1.22	งานโครงฝ้า ตรวระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42A-CEIL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	34 วัน	D707	D740	P01-C42A-MEP1(SS)+26; P07-C42A-CEIL-HOLD											
01.4.2.1.23	งานตกแต่งฝัผนัง P01-C42A-FLR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	36 วัน	D706	D741	P01-C42A-WFIN(SS)											
01.4.2.1.24	งานทาสีและเก็บฝัผนังสถาปัตยกรรม P01-C42A-PNT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	30 วัน	D725	D754	P01-C42A-WFIN(SS)+10; P01-C42A-CEIL(SS)											
01.4.2.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42A-SAN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	29 วัน	D729	D757	P01-C42A-PLB1; P01-C42A-WFIN(SS)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.4.2.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42A-FURN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	29 วัน	D735	D763	P01-C42A-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.4.2.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42A-MEP1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	60 วัน	D647	D706	P01-C42A-FRM(SS)*21; P05-PLT-MEP(SS); P11-C42A-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.4.2.1.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C42A-ELE1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	54 วัน	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42A-MEP-DOC											
01.4.2.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42A-ELE2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	30 วัน	D729	D758	P01-C42A-ELE1; P01-C42A-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.2.1.32.T22	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P01-C42A-ETST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	3 วัน	D768	D770	P01-C42A-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.4.2.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42A-PLB1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	54 วัน	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42A-MEP-DOC											
01.4.2.1.32.T23	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P01-C42A-PTST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D768	D770	P01-C42A-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.4.2.1.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42A-HV1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	54 วัน	D654	D707	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42A-MEP-DOC											
01.4.2.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42A-HV2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	31 วัน	D731	D761	P01-C42A-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.4.2.1.19	งานท่อและรางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C42A-ICT1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	46 วัน	D666	D711	P01-C42A-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42A-MEP-DOC											
01.4.2.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C42A-ICT2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	29 วัน	D735	D763	P01-C42A-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.4.2.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42A-EXT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	51 วัน	D707	D757	P01-C42A-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.4.2.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42A-PRECOM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	14 วัน	D754	D767	P01-C42A-SAN(SS); P01-C42A-ELE2(SS); P01-C42A-HV2(SS); P01-C42A-ICT2(SS); P05-...											
01.4.2.1.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C42A-FUNC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	3 วัน	D768	D770	P01-C42A-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-C42A-ETST(FF); P01-C42A-PTST(FF)											
01.4.2.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42A-COMM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	5 วัน	D771	D775	P01-C42A-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.4.2.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42A-SNAG · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	6 วัน	D771	D776	P01-C42A-COMM(SS)											
01.4.2.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42A-CORR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	3 วัน	D777	D779	P01-C42A-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.2.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42A-ASB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	26 วัน	D754	D779	P01-C42A-FRM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม						I				
01.4.2.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42A-HO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D780	D780	P01-C42A-CORR; P01-C42A-ASB; P01-C42A-COMM; P01-C42A-ENV; P01-C42A-...							◆				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						39 กิจกรรม						■				
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม						I				
01.4.2.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42B-REL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D570	D570	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P01-PRE-R...					◆						
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม						■				
01.4.2.2.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-C42B-SUR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	10 วัน	D570	D579	P01-C42B-REL					■						
01.4.2.2.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42B-EXC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	24 วัน	D578	D601	P01-C42B-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(SS); P08-C42B-EARTH-PTW; P10-C42B-EARTH-EN...					■						
01.4.2.2.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42B-BLI · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	13 วัน	D597	D609	P01-C42B-EXC(SS)+18					■						
01.4.2.2.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C42B-RBF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	14 วัน	D610	D623	P01-C42B-BLI; P06-STR-10; P11-C42B-STR-DOC					■						
01.4.2.2.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C42B-FMF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	14 วัน	D612	D625	P01-C42B-BLI; P11-C42B-STR-DOC					■						
01.4.2.2.07	จุดพักรวากก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42B-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D625	D625	P01-C42B-RBF; P01-C42B-FMF					◆						
01.4.2.2.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ป่อม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42B-FND · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	15 วัน	D625	D639	P01-C42B-HOLD; P05-PLT-STR(SS)					■						
01.4.2.2.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C42B-GB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	29 วัน	D634	D662	P01-C42B-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)					■						
01.4.2.2.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42B-FRM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	51 วัน	D653	D703	P01-C42B-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)						■					
01.4.2.2.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C42B-ROOF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	31 วัน	D688	D718	P01-C42B-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS); P08-C42B-WAH						■					
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม						■				
01.4.2.2.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C42B-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	31 วัน	D709	D739	P01-C42B-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-C42B-ARC-DOC						■					
01.4.2.2.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-C42B-EWALL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	51 วัน	D692	D742	P01-C42B-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11-C42B-ARC-DOC						■					
01.4.2.2.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42B-PART · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	46 วัน	D704	D749	P01-C42B-FRM(SS)+26; P11-C42B-ARC-DOC						■					
01.4.2.2.20	งานผนังและคิผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42B-WFIN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	39 วัน	D739	D777	P01-C42B-PART(SS)+34; P01-C42B-MEP1(SS) +8							■				
01.4.2.2.21	งานประตู หน้าต่าง กระฉก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42B-DRW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	43 วัน	D740	D782	P01-C42B-EWALL(SS); P06-ARC-10							■				
01.4.2.2.22	งานโครงฝ้า ตรวจาบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42B-CEIL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	34 วัน	D757	D790	P01-C42B-MEP1(SS)+26; P07-C42B-CEIL-HOLD							■				
01.4.2.2.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C42B-FLR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	36 วัน	D756	D791	P01-C42B-WFIN(SS)							■				
01.4.2.2.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C42B-PNT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	30 วัน	D775	D804	P01-C42B-WFIN(SS)+10; P01-C42B-CEIL(SS)							■				
01.4.2.2.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42B-SAN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	29 วัน	D779	D807	P01-C42B-PLB1; P01-C42B-WFIN(SS)							■				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.4.2.2.29	งานเฟอร์นิเจอร์บริเวณที่อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42B-FURN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	29 วัน	D785	D813	P01-C42B-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.4.2.2.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42B-MEP1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	60 วัน	D697	D756	P01-C42B-FRM(SS)*21; P05-PLT-MEP(SS); P11-C42B-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.4.2.2.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C42B-ELE1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54 วัน	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42B-MEP-DOC											
01.4.2.2.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42B-ELE2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	30 วัน	D779	D808	P01-C42B-ELE1; P01-C42B-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.2.2.32.T24	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P01-C42B-ETST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	3 วัน	D818	D820	P01-C42B-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.4.2.2.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42B-PLB1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54 วัน	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42B-MEP-DOC											
01.4.2.2.32.T25	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P01-C42B-PTST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D818	D820	P01-C42B-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.4.2.2.18	งานท้อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42B-HV1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54 วัน	D704	D757	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42B-MEP-DOC											
01.4.2.2.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42B-HV2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	31 วัน	D781	D811	P01-C42B-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.4.2.2.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C42B-ICT1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	46 วัน	D716	D761	P01-C42B-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42B-MEP-DOC											
01.4.2.2.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C42B-ICT2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	29 วัน	D785	D813	P01-C42B-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.4.2.2.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42B-EXT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	51 วัน	D757	D807	P01-C42B-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.4.2.2.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42B-PRECOM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	14 วัน	D804	D817	P01-C42B-SAN(SS); P01-C42B-ELE2(SS); P01-C42B-HV2(SS); P01-C42B-ICT2(SS); P05-...											
01.4.2.2.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C42B-FUNC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	3 วัน	D818	D820	P01-C42B-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-C42B-ETST(FF); P01-C42B-PTST(FF)											
01.4.2.2.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42B-COMM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	5 วัน	D821	D825	P01-C42B-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.4.2.2.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42B-SNAG · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	6 วัน	D821	D826	P01-C42B-COMM(SS)											
01.4.2.2.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42B-CORR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	3 วัน	D827	D829	P01-C42B-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.2.2.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42B-ASB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	26 วัน	D804	D829	P01-C42B-FRM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.2.2.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42B-HO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D830	D830	P01-C42B-CORR; P01-C42B-ASB; P01-C42B-COMM; P01-C42B-ENV; P01-C42B-...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						39 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.4.2.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42C-REL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D620	D620	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P01-PRE-R...											
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.4.2.3.02	งานปรับบริเวณ ส้วม และปักผัง P01-C42C-SUR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	10 วัน	D620	D629	P01-C42C-REL											
01.4.2.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42C-EXC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	24 วัน	D628	D651	P01-C42C-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(SS); P08-C42C-EARTH-PTW; P10-C42C-EARTH-E...											
01.4.2.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42C-BLI · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	13 วัน	D647	D659	P01-C42C-EXC(SS)+18											
01.4.2.3.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C42C-RBF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	14 วัน	D660	D673	P01-C42C-BLI; P06-STR-10; P11-C42C-STR-DOC											
01.4.2.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C42C-FMF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	14 วัน	D662	D675	P01-C42C-BLI; P11-C42C-STR-DOC											
01.4.2.3.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42C-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D675	D675	P01-C42C-RBF; P01-C42C-FMF											
01.4.2.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปุ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42C-FND · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	15 วัน	D675	D689	P01-C42C-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C42C-GB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29 วัน	D684	D712	P01-C42C-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42C-FRM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51 วัน	D703	D753	P01-C42C-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C42C-ROOF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31 วัน	D738	D768	P01-C42C-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS); P08-C42C-WAH											
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.4.2.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเลือกอาคาร P01-C42C-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31 วัน	D759	D789	P01-C42C-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-C42C-ARC-DOC											
01.4.2.3.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-C42C-EWALL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51 วัน	D742	D792	P01-C42C-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11-C42C-ARC-DOC											
01.4.2.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42C-PART · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	46 วัน	D754	D799	P01-C42C-FRM(SS)+26; P11-C42C-ARC-DOC											
01.4.2.3.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42C-WFIN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	39 วัน	D789	D827	P01-C42C-PART(SS)+34; P01-C42C-MEP1(SS)+8											
01.4.2.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42C-DRW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	43 วัน	D790	D832	P01-C42C-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.2.3.22	งานโครงฝ้า ตรวระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42C-CEIL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	34 วัน	D807	D840	P01-C42C-MEP1(SS)+26; P07-C42C-CEIL-HOLD											
01.4.2.3.23	งานตกแต่งฝัผนัง P01-C42C-FLR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	36 วัน	D806	D841	P01-C42C-WFIN(SS)											
01.4.2.3.24	งานทาสีและเก็บฝัสถาปัตยกรรม P01-C42C-PNT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	30 วัน	D825	D854	P01-C42C-WFIN(SS)+10; P01-C42C-CEIL(SS)											
01.4.2.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42C-SAN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29 วัน	D829	D857	P01-C42C-PLB1; P01-C42C-WFIN(SS)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.4.2.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42C-FURN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29 วัน	D835	D863	P01-C42C-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.4.2.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42C-MEP1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	60 วัน	D747	D806	P01-C42C-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(SS); P11-C42C-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						3 กิจกรรม										
01.4.2.3.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C42C-ELE1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54 วัน	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42C-MEP-DOC											
01.4.2.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42C-ELE2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	30 วัน	D829	D858	P01-C42C-ELE1; P01-C42C-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.2.3.32.T26	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P01-C42C-ETST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	3 วัน	D868	D870	P01-C42C-PRECOM											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.4.2.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42C-PLB1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54 วัน	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42C-MEP-DOC											
01.4.2.3.32.T27	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P01-C42C-PTST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 · รอยืนยันขอบเขต	3 วัน	D868	D870	P01-C42C-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.4.2.3.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42C-HV1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54 วัน	D754	D807	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42C-MEP-DOC											
01.4.2.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42C-HV2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31 วัน	D831	D861	P01-C42C-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.4.2.3.19	งานท่อและรางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C42C-ICT1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	46 วัน	D766	D811	P01-C42C-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C42C-MEP-DOC											
01.4.2.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C42C-ICT2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29 วัน	D835	D863	P01-C42C-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.4.2.3.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42C-EXT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51 วัน	D807	D857	P01-C42C-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						3 กิจกรรม										
01.4.2.3.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42C-PRECOM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	14 วัน	D854	D867	P01-C42C-SAN(SS); P01-C42C-ELE2(SS); P01-C42C-HV2(SS); P01-C42C-ICT2(SS); P05-...											
01.4.2.3.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C42C-FUNC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	3 วัน	D868	D870	P01-C42C-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-C42C-ETST(FF); P01-C42C-PTST(FF)											
01.4.2.3.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42C-COMM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	5 วัน	D871	D875	P01-C42C-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.4.2.3.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42C-SNAG · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	6 วัน	D871	D876	P01-C42C-COMM(SS)											
01.4.2.3.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42C-CORR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	3 วัน	D877	D879	P01-C42C-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.2.3.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42C-ASB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	26 วัน	D854	D879	P01-C42C-FRM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										I
01.4.2.3.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42C-HO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D880	D880	P01-C42C-CORR; P01-C42C-ASB; P01-C42C-COMM; P01-C42C-ENV; P01-C42C-...								◆			
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						40 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										I
01.4.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C43-REL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D650	D650	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P01-PRE-R...						◆					
งานโครงสร้าง						10 กิจกรรม										
01.4.3.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-C43-SUR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	8 วัน	D650	D657	P01-C43-REL						I					
01.4.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C43-EXC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	20 วัน	D656	D675	P01-C43-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(SS); P08-C43-EARTH-PTW; P10-C43-EARTH-ENV						I					
01.4.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C43-BLI · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11 วัน	D672	D682	P01-C43-EXC(SS)+15						I					
01.4.3.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C43-RBF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11 วัน	D683	D693	P01-C43-BLI; P06-STR-10; P11-C43-STR-DOC						I					
01.4.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C43-FMF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11 วัน	D684	D694	P01-C43-BLI; P11-C43-STR-DOC						I					
01.4.3.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C43-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D694	D694	P01-C43-RBF; P01-C43-FMF						◆					
01.4.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปุ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C43-FND · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	13 วัน	D694	D706	P01-C43-HOLD; P05-PLT-STR(SS)						I					
01.4.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C43-GB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25 วัน	D701	D725	P01-C43-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)						I					
01.4.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C43-FRM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41 วัน	D717	D757	P01-C43-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)							I				
01.4.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C43-ROOF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25 วัน	D746	D770	P01-C43-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS); P08-C43-WAH							I				
สถาปัตยกรรม						10 กิจกรรม										
01.4.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C43-ENV · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	26 วัน	D762	D787	P01-C43-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11-C43-ARC-DOC							I				
01.4.3.13	งานผนังภายนอก ฝัวมผนัง และช่องเปิด P01-C43-EWALL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41 วัน	D749	D789	P01-C43-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11-C43-ARC-DOC							I				
01.4.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C43-PART · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	38 วัน	D758	D795	P01-C43-FRM(SS)+21; P11-C43-ARC-DOC							I				
01.4.3.20	งานผนังและฝัวมผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C43-WFIN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	31 วัน	D787	D817	P01-C43-PART(SS)+27; P01-C43-MEP1(SS)+6							I				
01.4.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C43-DRW · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	34 วัน	D788	D821	P01-C43-EWALL(SS); P06-ARC-10							I				
01.4.3.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C43-CEIL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	27 วัน	D801	D827	P01-C43-MEP1(SS)+21; P07-C43-CEIL-HOLD							I				
01.4.3.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C43-FLR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	30 วัน	D800	D829	P01-C43-WFIN(SS)							I				
01.4.3.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C43-PNT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24 วัน	D816	D839	P01-C43-WFIN(SS)+8; P01-C43-CEIL(SS)							I				
01.4.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C43-SAN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	23 วัน	D819	D841	P01-C43-PLB1; P01-C43-WFIN(SS)								I			

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
สถาปัตยกรรม (ต่อ)						10 กิจกรรม										
01.4.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C43-FURN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24 วัน	D823	D846	P01-C43-PNT(SS)											
งานระบบประกอบอาคาร						1 กิจกรรม										
01.4.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C43-MEP1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	48 วัน	D753	D800	P01-C43-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS); P11-C43-MEP-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						2 กิจกรรม										
01.4.3.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C43-ELE1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44 วัน	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C43-MEP-DOC											
01.4.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C43-ELE2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24 วัน	D819	D842	P01-C43-ELE1; P01-C43-CEIL(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย						2 กิจกรรม										
01.4.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C43-PLB1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44 วัน	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C43-MEP-DOC											
01.4.3.32.T28	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P01-C43-PTST · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1 วัน	D851	D851	P01-C43-PRECOM											
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						2 กิจกรรม										
01.4.3.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C43-HV1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	44 วัน	D758	D801	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C43-MEP-DOC											
01.4.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C43-HV2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	25 วัน	D820	D844	P01-C43-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานระบบพิเศษ						2 กิจกรรม										
01.4.3.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C43-ICT1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	37 วัน	D768	D804	P01-C43-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P11-C43-MEP-DOC											
01.4.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C43-ICT2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · รอยืนยันขอบเขต	24 วัน	D823	D846	P01-C43-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-MEP(SS)											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						1 กิจกรรม										
01.4.3.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C43-EXT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41 วัน	D801	D841	P01-C43-GB											
งานทดสอบและเดินระบบ						4 กิจกรรม										
01.4.3.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางท่อน P01-C43-PRECOM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	12 วัน	D839	D850	P01-C43-SAN(SS); P01-C43-ELE2(SS); P01-C43-HV2(SS); P01-C43-ICT2(SS); P05-PL...											
01.4.3.32	งานทดสอบการทำงานรยระบบ P01-C43-FUNC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1 วัน	D851	D851	P01-C43-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P01-C43-PTST(FF); P01-C43-CTST(FF)											
01.4.3.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C43-COMM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	4 วัน	D852	D855	P01-C43-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.3.37.01	งานทดลองเดินระบบปั้ม ท่อ และระบบควบคุม P01-C43-EX01 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	6 วัน	D851	D856	P01-C43-PRECOM											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						2 กิจกรรม										
01.4.3.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C43-SNAG · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	5 วัน	D852	D856	P01-C43-COMM(SS)											
01.4.3.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C43-CORR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	3 วัน	D857	D859	P01-C43-SNAG											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.3.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C43-ASB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	21 วัน	D839	D859	P01-C43-FRM											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.4.3.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C43-HO · อาคารห้องบ่ม พื้นที่ C	จุด	D860	D860	P01-C43-CORR; P01-C43-ASB; P01-C43-COMM; P01-C43-ENV; P01-C43-DR...								◆			
งานไฟฟ้าและระบบควบคุม						1 กิจกรรม										
01.4.3.32.T29	งานทดสอบไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือวัด และระบบควบคุม — อาคารห้องบ่ม พื้นที่ C P01-C43-CTST · อาคารห้องบ่ม พื้นที่ C	1 วัน	D851	D851	P01-C43-PRECOM											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D51-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D301	D301	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D...			◆								
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.5.1.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D51-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	20 วัน	D301	D320	P01-D51-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.5.1.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D51-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	64 วัน	D327	D390	P01-D51-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D51-CIV-DOC; P08-D51-...											
01.5.1.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D51-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	84 วัน	D397	D480	P01-D51-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D51-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.5.1.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D51-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · รอยืนยันขอบเขต	83 วัน	D461	D543	P01-D51-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D51-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.5.1.08	งานผิวทาง ทางเดิน ดันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-D51-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	78 วัน	D454	D531	P01-D51-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-D(SS); P11-D51-LAND-DOC											
01.5.1.10	งานครุภัณฑ์สนาม บ้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D51-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	62 วัน	D508	D569	P01-D51-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.5.1.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D51-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	65 วัน	D486	D550	P01-D51-EW; P05-PLT-D(SS); P11-D51-LAND-DOC											
01.5.1.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกพื้นฟูพื้นที่ P01-D51-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	58 วัน	D531	D588	P01-D51-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-D(SS); P11-D51-LAND-DOC											
01.5.1.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D51-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	71 วัน	D531	D601	P01-D51-UTIL; P01-D51-SOFT(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D51-LAND-DOC											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.5.1.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D51-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	87 วัน	D349	D435	P01-D51-EW(SS)+16; P05-PLT-D(SS); P11-D51-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.5.1.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D51-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · รอยืนยันขอบเขต	68 วัน	D400	D467	P01-D51-EW(SS)+26; P06-D-10; P05-PLT-D(SS); P11-D51-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและพื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.5.1.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-D51-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	291 วัน	D317	D607	P01-D51-CTRL(SS)											
01.5.1.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และพื้นฟูพื้นที่ P01-D51-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	33 วัน	D582	D614	P01-D51-SOFT(SS); P01-D51-PAVE											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม					■					
01.5.1.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D51-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	13 วัน	D607	D619	P01-D51-REST(SS); P01-D51-ELE; P01-D51-IRR(SS)						■					
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม					I					
01.5.1.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D51-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D620	D620	P01-D51-FIN; P01-D51-FURN; P01-D51-MON						◆					
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.5.1.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D51-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	29 วัน	D311	D339	P01-D51-SUR(SS)											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจัดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D52-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	จุด	D430	D430	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.5.2.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D52-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	22 วัน	D430	D451	P01-D52-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.5.2.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D52-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71 วัน	D458	D528	P01-D52-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-CIV-DOC; P08-D52-...											
01.5.2.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D52-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	92 วัน	D535	D626	P01-D52-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.5.2.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D52-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · รอยืนยันขอบเขต	92 วัน	D605	D696	P01-D52-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.5.2.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-D52-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	85 วัน	D598	D682	P01-D52-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-D(SS); P11-D52-LAND-DOC											
01.5.2.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D52-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	67 วัน	D658	D724	P01-D52-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.5.2.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D52-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71 วัน	D633	D703	P01-D52-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-LAND-DOC											
01.5.2.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D52-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	64 วัน	D682	D745	P01-D52-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-LAND-DOC											
01.5.2.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D52-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	78 วัน	D682	D759	P01-D52-UTIL; P01-D52-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D52-...											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.5.2.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D52-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	95 วัน	D483	D577	P01-D52-EW(SS)+18; P05-PLT-D(SS); P11-D52-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.5.2.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D52-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · รอยืนยันขอบเขต	106 วัน	D507	D612	P01-D52-EW(SS)+28; P06-D-10; P05-PLT-D(SS) ; P11-D52-UTIL-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.5.2.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาระหว่างก่อสร้าง P01-D52-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	319 วัน	D448	D766	P01-D52-CTRL(SS)											
01.5.2.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D52-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	36 วัน	D738	D773	P01-D52-SOFT(SS); P01-D52-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.5.2.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D52-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	14 วัน	D766	D779	P01-D52-REST(SS); P01-D52-ELE; P01-D52-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.5.2.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D52-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	จุด	D780	D780	P01-D52-FIN; P01-D52-FURN; P01-D52-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.5.2.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D52-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	32 วัน	D441	D472	P01-D52-SUR(SS)											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D53-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	จุด	D600	D600	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D-REL											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.5.3.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D53-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	23 วัน	D600	D622	P01-D53-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.5.3.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D53-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73 วัน	D629	D701	P01-D53-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-CIV-DOC; P08-D53-REL											
01.5.3.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D53-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	95 วัน	D708	D802	P01-D53-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.5.3.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D53-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · รออินฮันขอบเขต	95 วัน	D780	D874	P01-D53-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.5.3.08	งานผิวทาง ทางเดิน ดันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-D53-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	87 วัน	D773	D859	P01-D53-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-LAND-DOC											
01.5.3.10	งานครุภัณฑ์สนาม บ้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D53-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	69 วัน	D834	D902	P01-D53-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.5.3.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D53-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73 วัน	D809	D881	P01-D53-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-LAND-DOC											
01.5.3.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D53-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	66 วัน	D859	D924	P01-D53-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-LAND-DOC											
01.5.3.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D53-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	80 วัน	D859	D938	P01-D53-UTIL; P01-D53-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D53-REL											
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.5.3.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D53-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	98 วัน	D654	D751	P01-D53-EW(SS)*18; P05-PLT-D(SS); P11-D53-CIV-DOC											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.5.3.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D53-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · รอยืนยันขอบเขต	109 วัน	D679	D787	P01-D53-EW(SS)×29; P06-D-10; P05-PLT-D(SS) ; P11-D53-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.5.3.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาระหว่างก่อสร้าง P01-D53-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	329 วัน	D618	D946	P01-D53-CTRL(SS)											
01.5.3.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D53-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	37 วัน	D917	D953	P01-D53-SOFT(SS); P01-D53-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.5.3.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D53-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	14 วัน	D946	D959	P01-D53-REST(SS); P01-D53-ELE; P01-D53-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.5.3.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D53-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	จุด	D960	D960	P01-D53-FIN; P01-D53-FURN; P01-D53-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.5.3.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซา ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D53-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	33 วัน	D611	D643	P01-D53-SUR(SS)											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						17 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.4.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D54-REL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	จุด	D760	D760	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D-...											
งานสำรวจและปักผัง						1 กิจกรรม										
01.5.4.02	งานสำรวจ บักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D54-SUR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	20 วัน	D760	D779	P01-D54-REL											
งานโครงสร้างและงานโยธา						2 กิจกรรม										
01.5.4.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D54-EW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65 วัน	D786	D850	P01-D54-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-CIV-DOC; P08-D54-...											
01.5.4.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D54-BASE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	84 วัน	D856	D939	P01-D54-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-CIV-DOC											
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						1 กิจกรรม										
01.5.4.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D54-ELE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · รอยืนยันขอบเขต	84 วัน	D920	D1003	P01-D54-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-UTIL-DOC											
งานภูมิทัศน์และงานภายนอก						2 กิจกรรม										
01.5.4.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-D54-PAVE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	77 วัน	D914	D990	P01-D54-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-LAND-DOC											
01.5.4.10	งานครุภัณฑ์สนาม บ้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D54-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	62 วัน	D968	D1029	P01-D54-PAVE(SS)											
งานภูมิทัศน์						3 กิจกรรม										
01.5.4.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D54-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65 วัน	D946	D1010	P01-D54-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-LAND-DOC											
01.5.4.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D54-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	59 วัน	D990	D1048	P01-D54-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-LAND-DOC											
01.5.4.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D54-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	72 วัน	D990	D1061	P01-D54-UTIL; P01-D54-SOFT(SS); P05-PLT-LAND(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D54-...											


WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานระบบระบายน้ำ						1 กิจกรรม										
01.5.4.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D54-DRN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	87 วัน	D808	D894	P01-D54-EW(SS)*16; P05-PLT-D(SS); P11-D54-CIV-DOC											
งานระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
01.5.4.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D54-UTIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · รอยยืนขอบเขต	97 วัน	D830	D926	P01-D54-EW(SS)*26; P06-D-10; P05-PLT-D(SS) ; P11-D54-UTIL-DOC											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						2 กิจกรรม										
01.5.4.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-D54-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	292 วัน	D776	D1067	P01-D54-CTRL(SS)											
01.5.4.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D54-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	33 วัน	D1042	D1074	P01-D54-SOFT(SS); P01-D54-PAVE; P05-PLT-LAND(SS)											
งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง						1 กิจกรรม										
01.5.4.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D54-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	13 วัน	D1067	D1079	P01-D54-REST(SS); P01-D54-ELE; P01-D54-IRR(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.5.4.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D54-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	จุด	D1080	D1080	P01-D54-FIN; P01-D54-FURN; P01-D54-MON											
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						1 กิจกรรม										
01.5.4.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D54-CTRL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	29 วัน	D770	D798	P01-D54-SUR(SS)											
แผนสูบน้ำดิบ						14 กิจกรรม										
งานบริหารและจุดควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.5.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่งานใกล้น้ำ P01-D55-REL · แผนสูบน้ำดิบ	จุด	D820	D820	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D-											
งานสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู						1 กิจกรรม										
01.5.5.13	ตรวจสอบสภาพหลังงาน การรั่วไหล คุณภาพน้ำ และการฟื้นฟูพื้นที่ P01-D55-AFT · แผนสูบน้ำดิบ	14 วัน	D1013	D1026	P01-D55-FUNC(SS)											
งานทดสอบและเดินระบบ						2 กิจกรรม										
01.5.5.11	งานเตรียมทดสอบ ตรวจสอบวน ตรวจทิศทางหมุน ล้างท่อ และตรวจจุด P01-D55-PRE · แผนสูบน้ำดิบ	10 วัน	D1002	D1011	P01-D55-PIPE; P01-D55-PUMP; P01-D55-ELE; P11-D55-TST-DOC											
01.5.5.12	ทดสอบการทำงาน อัตราการไหล และระบบควบคุมบิ่มน้ำดิบ P01-D55-FUNC · แผนสูบน้ำดิบ	11 วัน	D1012	D1022	P01-D55-PRE; P05-PLT-MEP(SS)											
งานส่งมอบ						1 กิจกรรม										
01.5.5.99	จุดส่งมอบระบบแผนสูบน้ำดิบ P01-D55-HO · แผนสูบน้ำดิบ	จุด	D1030	D1030	P01-D55-FUNC; P01-D55-AFT											
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						1 กิจกรรม										
01.5.5.03	เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ผู้เฝ้าระวัง และระบบสื่อสาร P01-D55-RES · แผนสูบน้ำดิบ	18 วัน	D824	D841	P01-D55-BEF(SS)											
งานโครงสร้างทางน้ำและโยธา						3 กิจกรรม										
01.5.5.04	จัดเตรียมทางเข้า พื้นที่ยก และพื้นที่ขนถ่ายควบคุม P01-D55-ACC · แผนสูบน้ำดิบ	30 วัน	D837	D866	P01-D55-RES(SS); P05-PLT-D(SS)											
01.5.5.05	ผลิตและประกอบล่องหน้าแพหรือโครงสร้างลอยน้ำ P01-D55-FAB · แผนสูบน้ำดิบ	70 วัน	D831	D900	P06-D-10; P11-D55-MAR-DOC											


WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
งานโครงสร้างทางน้ำและโยธา (ต่อ)						3 กิจกรรม										
01.5.5.07	ติดตั้งแพหรือโครงสร้างลอยน้ำ P01-D55-PONT · แพลบน้ำดิบ	51 วัน	D904	D954	P01-D55-LIFT(SS); P01-D55-FAB; P05-PLT-D(SS); P11-D55-MAR-DOC; P08-D55-WATER-PT...											
งานไฟฟ้าและระบบควบคุม						1 กิจกรรม										
01.5.5.10	ติดตั้งไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม ป้องกัน และเครื่องมือวัด P01-D55-ELE · แพลบน้ำดิบ	39 วัน	D963	D1001	P06-MEP-10; P01-D55-PUMP(SS); P05-PLT-D(SS)											
งานยกและเคลื่อนย้าย						1 กิจกรรม										
01.5.5.06	จัดทำแผนยก ตั้งเครน เขตห้ามเข้า และทดลองยก P01-D55-LIFT · แพลบน้ำดิบ	26 วัน	D883	D908	P01-D55-ACC; P01-D55-FAB(SS); P05-PLT-D(SS); P11-D55-MAR-DOC; P08-D55-LIFT-PW;...											
งานระบบกระบวนการ						2 กิจกรรม										
01.5.5.08	ติดตั้งท่อสูบน้ำดิบ วาล์ว และอุปกรณ์รองรับ P01-D55-PIPE · แพลบน้ำดิบ	52 วัน	D933	D984	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-D(SS)											
01.5.5.09	ติดตั้งและปรับแนวบิ่มน้ำดิบ P01-D55-PUMP · แพลบน้ำดิบ	43 วัน	D946	D988	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-PLT-D(SS)											
งานสำรวจและสิ่งแวดล้อม						1 กิจกรรม										
01.5.5.02	ตรวจสอบสภาพก่อนเริ่มงาน ระดับน้ำ ทางเข้า และสภาพอากาศ P01-D55-BEF · แพลบน้ำดิบ	18 วัน	D820	D837	P01-D55-REL											
พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก						1 กิจกรรม										
จุดควบคุมกรอบเวลาหลัก						1 กิจกรรม										
01.5.98	จุดควบคุม CP-06 งานพื้นที่ B/C/D และระบบภายนอกแล้วเสร็จ P01-CP06-GATE · พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก	จุด	D960	D960	P01-A21-HO; P01-A22-HO; P01-A27-HO; P01-B31-HO; P01-B32-HO; P01-B33-HO; P01-...											
งานปิดโครงการและส่งมอบ						12 กิจกรรม										
งานทดสอบและเดินระบบ						2 กิจกรรม										
01.6.02	งานทดสอบระบบและปิดงานเดินระบบแบบบูรณาการ P01-CO-002 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	60 วัน	D1081	D1140	P01-CO-001											
01.6.02.3	รวบรวม ตรวจสอบ และรับรองรายงานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นสุดท้าย P01-CO-D495 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	21 วัน	D1140	D1160	P02-M494											
งานแบบก่อสร้างจริงและส่งมอบ						2 กิจกรรม										
01.6.02.2	ตรวจสอบและออกแบบก่อสร้างจริงและแบบ BIM ตามสภาพก่อสร้างจริงฉบับควบคุม P01-CO-D494 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	31 วัน	D1110	D1140	P02-M493											
01.6.03	จัดทำแบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้งาน การรับประกัน การฝึกอบรม และข้อมูลทรัพย์สิน P01-CO-003 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	110 วัน	D1081	D1190	P01-CO-001; P14-AI-009(FF)											
งานคู่มือและการฝึกอบรม						1 กิจกรรม										
01.6.02.4	ปิดงานคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา การรับประกัน อะไหล่ ข้อมูลเดินระบบ และการฝึกอบรม P01-CO-D496 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	21 วัน	D1160	D1180	P02-M495											
งานทะเบียนทรัพย์สิน						1 กิจกรรม										
01.6.02.5	จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน หมายเลขประจำเครื่อง ตำแหน่ง และสรุปมูลค่ารายการขั้นสุดท้าย P01-CO-D497 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	16 วัน	D1180	D1195	P02-M496											
งานปิดโครงการและส่งมอบ						5 กิจกรรม										
01.6.01	งานบูรณาการภูมิทัศน์ ระบบภายนอก และรายการแก้ไขก่อนส่งมอบ P01-CO-001 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	240 วัน	D841	D1080	P01-CP05-GATE+1; P01-CP06-GATE(FF)+120; P01-A21-HO(FF); P01-A22-HO(FF); P01-A23-H...											
01.6.02.1	งานทำความสะอาดขั้นสุดท้าย ประสานการรื้อถอนงานชั่วคราว และตรวจสอบมอบพื้นที่ P01-CO-D493 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	30 วัน	D1081	D1110	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P10-ENV-REST(FF); P16-HER-REST(FF); P04-...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
งานปิดโครงการและส่งมอบ (ต่อ)						5 กิจกรรม										
01.6.02.6	ตรวจร่วมขั้นสุดท้าย ปิดหลักฐานคงค้าง และดำเนินการตรวจรับ P01-CO-ACC · งานปิดโครงการและส่งมอบ	6 วัน	D1195	D1200	P02-M497; P01-CO-005											
01.6.05	จุดอนุมัติความพร้อมก่อนส่งมอบโครงการขั้นสุดท้าย P01-CO-005 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	จุด	D1195	D1195	P01-CO-002; P01-CO-003; P01-CO-004; P15-CAR-FIN; P13-BIM-HO; P07-QA-COMM; P...											
01.6.06	จุดตรวจรับโครงการขั้นสุดท้าย ณ วันที่ 1,200 P01-CO-006 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	จุด	D1200	D1200	P01-CO-005; P02-M497; P01-CO-ACC; P11-CDE-CO; P12-PRG-CO											
งานฟื้นฟูพื้นที่						1 กิจกรรม										
01.6.04	รื้อถอนงานชั่วคราวและตรวจรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและมรดกโลก P01-CO-004 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	90 วัน	D1081	D1170	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P05-PLT-DEMOB(FF); P09-TRF-REST(FF); P1...											
แผนที่ 02 — แผนงบประมาณก่อสร้าง						17 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						4 กิจกรรม										
02.1.1	จัดทำทะเบียนงวดงาน 1–497 และเชื่อมโยง WBS, BOQ, กิจกรรม และหลักฐาน P02-COM-001 · ทั้งโครงการ	35 วัน	D1	D35	P01-PRE-NTP											
02.1.2	จัดทำงบประมาณฐาน กระแสเงินสด และระบบควบคุมภาระผูกพัน P02-COM-002 · ทั้งโครงการ	41 วัน	D20	D60	P02-COM-001(SS)+19											
02.1.3	จัดทำรายการตรวจสอบความพร้อมเบิกจ่ายด้านผลงานจริง คุณภาพ และเอกสาร P02-COM-003 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D45	D75	P02-COM-001(SS)+44; P07-QA-001; P11-CDE-004(FF)											
02.4.1	รอบประมาณการต้นทุนจนแล้วเสร็จ ต้นทุน กระแสเงินสด และภาระผูกพัน P02-COM-FTC · ทั้งโครงการ	1120 วัน	D61	D1180	P02-COM-002; P02-COM-A(FF); P02-COM-B(FF); P02-COM-C(FF); P02-COM-D(FF)											
งวดงานที่ 1						1 กิจกรรม										
02.2.1	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 1: บุคลากรหลัก สำนักงานสนาม และร่างผังพื้นที่ P02-M01 · งวดงานที่ 1	จุด	D30	D30	P04-WF-001; P03-SITE-001(SS)											
งวดงานที่ 2						1 กิจกรรม										
02.2.2	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 2: งานสำรวจและหมุดอ้างอิง X/Y/Z P02-M02 · งวดงานที่ 2	จุด	D60	D60	P03-SITE-001; P02-M01											
งวดงานที่ 3						1 กิจกรรม										
02.2.3	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 3: แบบผังพื้นที่ก่อสร้างฉบับละเอียด P02-M03 · งวดงานที่ 3	จุด	D90	D90	P03-SITE-001; P02-M02											
งวดงานที่ 24						1 กิจกรรม										
02.2.24	จุดตรวจงวดที่ 24: งานรื้อย้าย โยกย้าย และเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จ P02-M24 · งวดงานที่ 24	จุด	D180	D180	P03-SITE-003; P02-M03											
พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
02.3.A	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ A P02-COM-A · พื้นที่ A	740 วัน	D181	D920	P02-COM-003											
พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
02.3.B	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ B P02-COM-B · พื้นที่ B	441 วัน	D500	D940	P02-COM-003											
พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
02.3.C	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ C P02-COM-C · พื้นที่ C	441 วัน	D520	D960	P02-COM-003											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
พื้นที่ D						1 กิจกรรม										
02.3.D	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ D P02-COM-D · พื้นที่ D	780 วัน	D301	D1080	P02-COM-003											
งวดงานที่ 493						1 กิจกรรม										
02.5.493	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 493: ทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ P02-M493 · งวดงานที่ 493	จุด	D1110	D1110	P01-CO-D493											
งวดงานที่ 494						1 กิจกรรม										
02.5.494	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 494: แบบก่อสร้างจริงและ BIM P02-M494 · งวดงานที่ 494	จุด	D1140	D1140	P01-CO-D494											
งวดงานที่ 495						1 กิจกรรม										
02.5.495	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 495: รายงานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล P02-M495 · งวดงานที่ 495	จุด	D1160	D1160	P01-CO-D495											
งวดงานที่ 496						1 กิจกรรม										
02.5.496	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 496: คู่มือการใช้งาน บำรุงรักษา และการรับประกัน P02-M496 · งวดงานที่ 496	จุด	D1180	D1180	P01-CO-D496											
งวดงานที่ 497						1 กิจกรรม										
02.5.497	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 497: ทะเบียนทรัพย์สินและมูลค่ารายการขั้นสุดท้าย P02-M497 · งวดงานที่ 497	จุด	D1195	D1195	P01-CO-D497											
แผนที่ 03 — แผนการจัดการสถานที่ก่อสร้าง						14 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						6 กิจกรรม										
03.1.1	จัดทำผังโลจิสติกส์ ทางเข้า และสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวจากผลสำรวจ P03-SITE-001 · ทั้งโครงการ	30 วัน	D1	D30	P01-PRE-NTP											
03.1.2	จัดตั้งสำนักงานสนาม สวัสดิการ ปฐมพยาบาล และศูนย์ประสานงาน P03-SITE-002 · ทั้งโครงการ	41 วัน	D20	D60	P03-SITE-001(SS)+19											
03.1.3	ติดตั้งไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ ดับเพลิง และสื่อสารชั่วคราว P03-SITE-003 · ทั้งโครงการ	66 วัน	D25	D90	P03-SITE-001(SS)+24											
03.1.4	จัดตั้งคลังวัสดุ พื้นที่กักกัน ลานเครื่องจักร และพื้นที่เชื้อเพลิง-ซ่อมบำรุงควบคุม P03-SITE-004 · ทั้งโครงการ	51 วัน	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
03.1.5	แยกทางคนและรถ กำหนดเส้นทางฉุกเฉิน จุลรวมพล และป้าย P03-SITE-005 · ทั้งโครงการ	51 วัน	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
03.3.1	รื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบชั่วคราว พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ P03-SITE-DEMOB · ทั้งโครงการ	61 วัน	D1050	D1110	P03-SITE-D-OPS(FF); P03-SITE-A-OPS(FF); P03-SITE-B-OPS(FF); P03-SITE-C-OPS(FF)											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
03.2.A.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ A P03-SITE-A-REL · พื้นที่ A	16 วัน	D165	D180	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-A-REL; P10-ENV-A-REL; P04-WF-002; P05-PLT-002; P...											
03.2.A.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ A P03-SITE-A-OPS · พื้นที่ A	770 วัน	D181	D950	P03-SITE-A-REL											
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
03.2.B.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ B P03-SITE-B-REL · พื้นที่ B	10 วัน	D490	D499	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-B-REL; P10-ENV-B-REL; P04-WF-002; P05-PLT-002; P...											
03.2.B.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ B P03-SITE-B-OPS · พื้นที่ B	421 วัน	D500	D920	P03-SITE-B-REL											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
03.2.C.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ C P03-SITE-C-REL · พื้นที่ C	10 วัน	D510	D519	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-C-REL; P10-ENV-C-REL; P04-WF-002; P05-PLT-002;...											
03.2.C.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ C P03-SITE-C-OPS · พื้นที่ C	421 วัน	D520	D940	P03-SITE-C-REL											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
03.2.D.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ D P03-SITE-D-REL · พื้นที่ D	20 วัน	D281	D300	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-D-REL; P10-ENV-D-REL; P16-HER-D-PERMIT; P04-W...											
03.2.D.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ D P03-SITE-D-OPS · พื้นที่ D	760 วัน	D301	D1060	P03-SITE-D-REL											
แผนที่ 04 — แผนอัตรากำลัง						9 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						4 กิจกรรม										
04.1.1	ระดมทีมบริหาร วิศวกรรม สำรวจ ความปลอดภัย และควบคุมเอกสารหลัก P04-WF-001 · ทั้งโครงการ	15 วัน	D1	D15	P01-PRE-NTP											
04.1.2	จัดทำเมทริกซ์สมรรถนะ ใบอนุญาต การมอบอำนาจ และการฝึกอบรมบุคลากร P04-WF-002 · ทั้งโครงการ	26 วัน	D5	D30	P04-WF-001(SS)+4											
04.1.3	ระดมชุดสำรวจ งานชั่วคราว และชุดสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้าง P04-WF-003 · ทั้งโครงการ	71 วัน	D20	D90	P04-WF-002(SS)+14											
04.4.1	รอบทบทวนกำลังคน ชั่วโมงทำงาน ผลผลิตภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน P04-WF-REVIEW · ทั้งโครงการ	1150 วัน	D31	D1180	P04-WF-002											
พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
04.2.A	เพิ่มและปรับสมตุลกำลังคนงานโยธา โครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบ ภูมิทัศน์ คุณภาพ ความปลอดภัย และ BIM พื้นที่ A P04-WF-A · พื้นที่ A	741 วัน	D160	D900	P04-WF-002											
พื้นที่ B/C						1 กิจกรรม										
04.2.BC	ย้ายและระดมทีมจากพื้นที่ A ไปพื้นที่ B/C โดยรักษาความต่อเนื่องของทักษะ P04-WF-BC · พื้นที่ B/C	441 วัน	D480	D920	P04-WF-A(SS)+319											
พื้นที่ D						1 กิจกรรม										
04.2.D	จัดชุดงานผลกระทบและผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ D P04-WF-D · พื้นที่ D	781 วัน	D280	D1060	P04-WF-002											
งานปิดโครงการและส่งมอบ						2 กิจกรรม										
04.3.1	ปรับกำลังคนเข้าสู่งานทดสอบ BIM แบบก่อสร้างจริง เอกสาร ทรัพย์สิน และปิดข้อบกพร่อง P04-WF-CO · งานปิดโครงการและส่งมอบ	281 วัน	D900	D1180	P04-WF-A(FF); P04-WF-BC(FF); P04-WF-D(FF); P04-WF-REVIEW(FF)											
04.3.2	ทยอยถอนกำลังคนหลังการตรวจรับและส่งมอบพื้นที่ P04-WF-DEMOB · งานปิดโครงการและส่งมอบ	121 วัน	D1080	D1200	P04-WF-CO(SS)+179											
แผนที่ 05 — แผนการใช้เครื่องจักรกล						8 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						6 กิจกรรม										
05.1.1	จัดทำทะเบียนเครื่องจักร หลักเกณฑ์คัดเลือก และขั้นตอนขออนุญาตนำเข้าใช้งาน P05-PLT-001 · ทั้งโครงการ	45 วัน	D1	D45	P01-PRE-NTP											
05.1.2	จัดทำเมทริกซ์สมรรถนะผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด และช่างซ่อมบำรุง P05-PLT-002 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D20	D50	P05-PLT-001(SS)+19; P04-WF-002(SS)+14											
05.2.EARTH	ระดมและใช้งานเครื่องจักรงานดินและงานถนน P05-PLT-EARTH · ทั้งโครงการ	671 วัน	D150	D820	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											
05.2.LAND	ใช้งานเครื่องจักรภูมิทัศน์และเครื่องจักรแรงกดพื้นต่ำ P05-PLT-LAND · ทั้งโครงการ	481 วัน	D600	D1080	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											

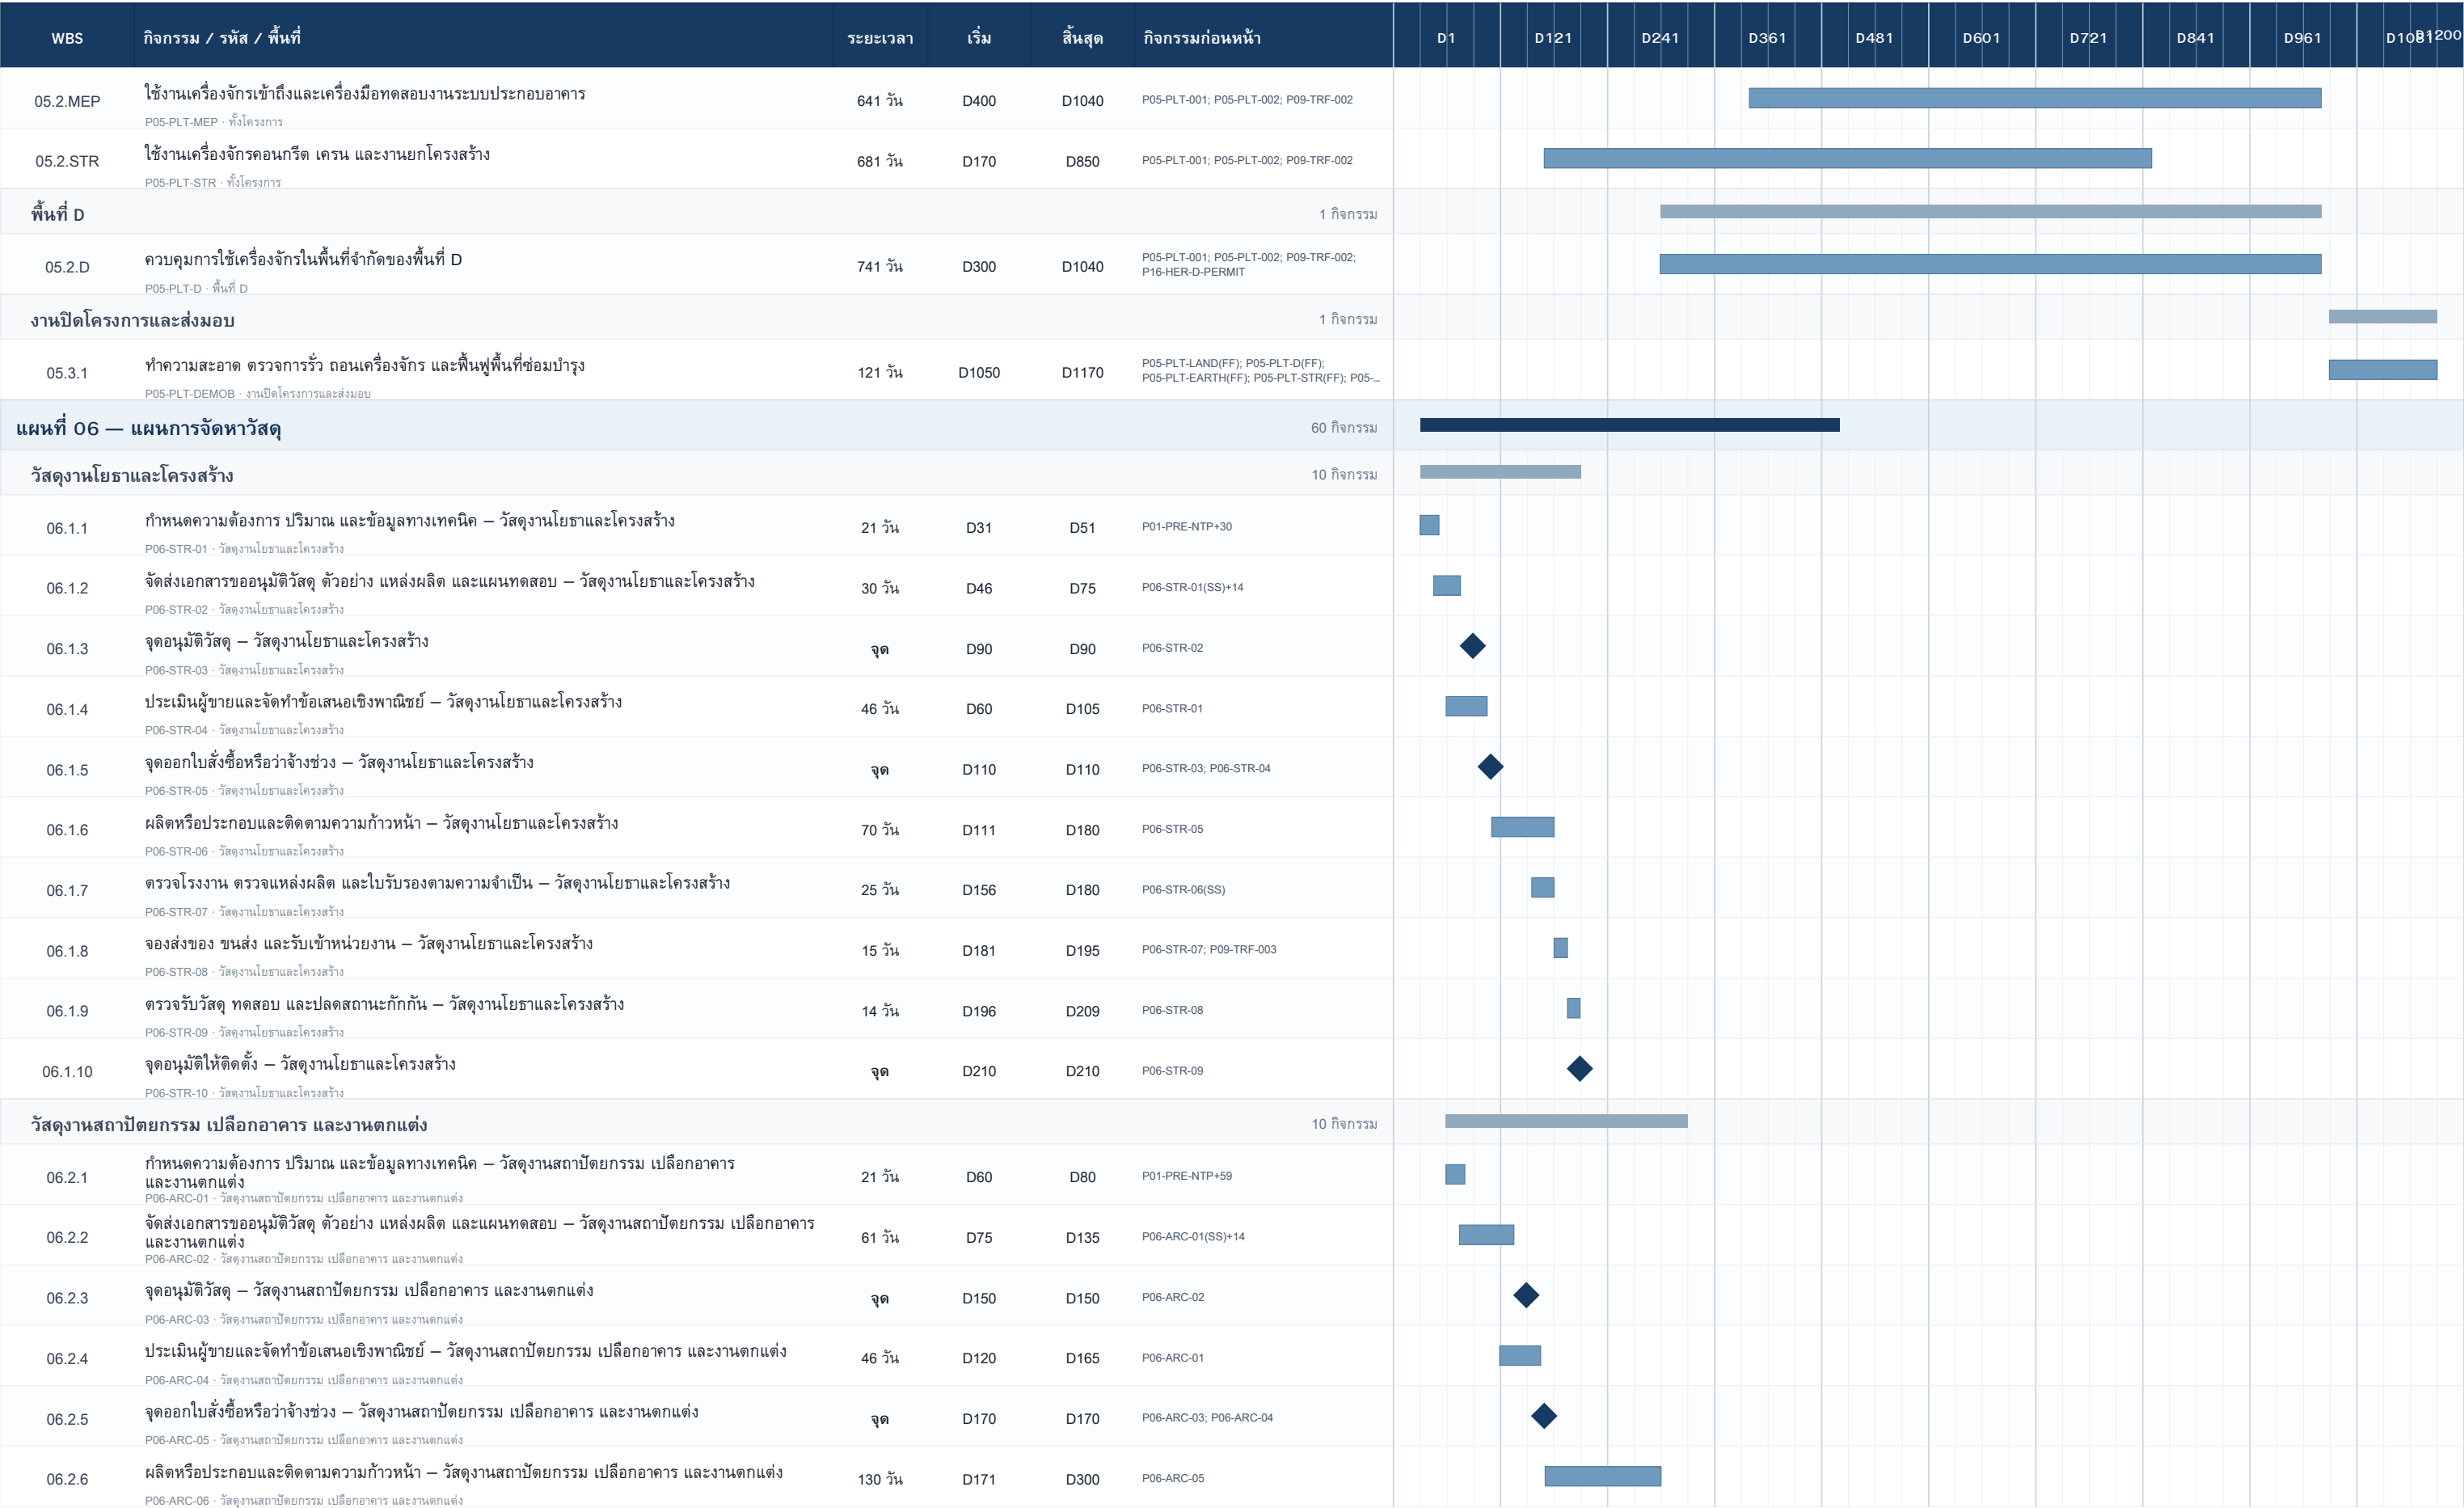

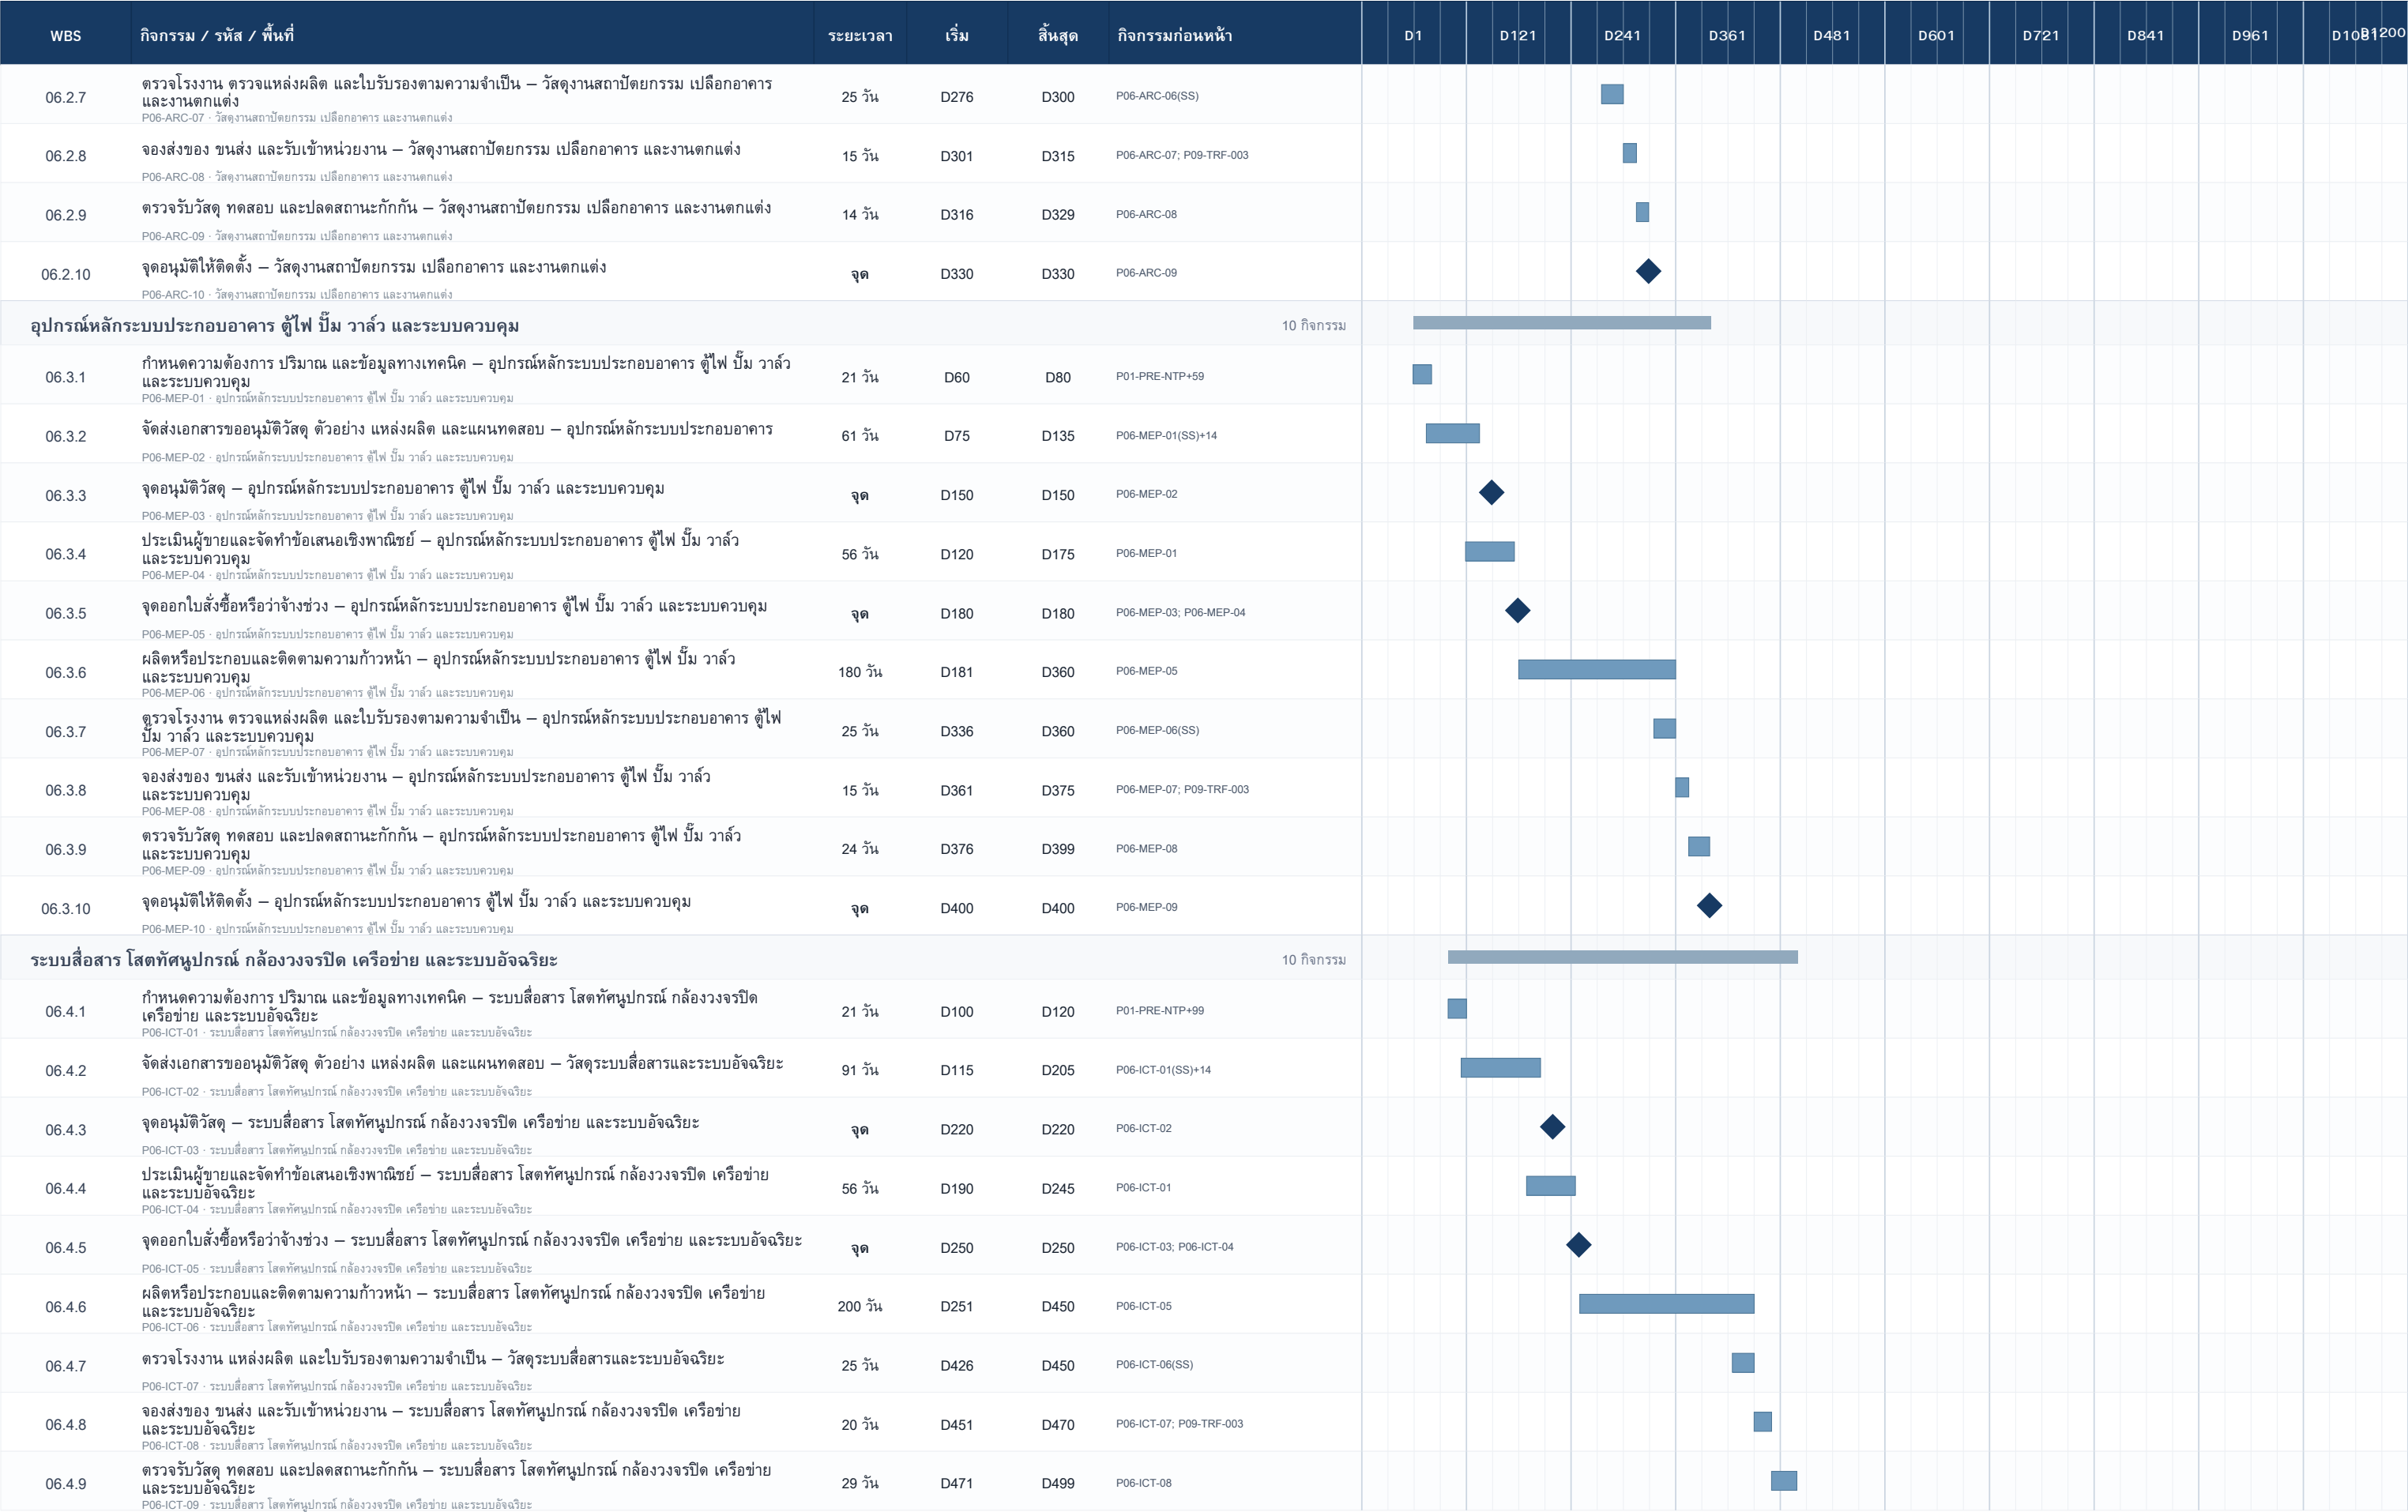

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
06.4.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระบบอัจฉริยะ P06-ICT-10 · ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระบบอัจฉริยะ	จุด	D500	D500	P06-ICT-09					◆						
วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก					10 กิจกรรม											
06.5.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-01 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	21 วัน	D140	D160	P01-PRE-NTP+139											
06.5.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-02 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	51 วัน	D155	D205	P06-LAND-01(SS)+14											
06.5.3	จุดอนุมัติวัสดุ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-03 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	จุด	D220	D220	P06-LAND-02			◆								
06.5.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-04 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	46 วัน	D190	D235	P06-LAND-01											
06.5.5	จัดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-05 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	จุด	D240	D240	P06-LAND-03; P06-LAND-04			◆								
06.5.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-06 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	40 วัน	D241	D280	P06-LAND-05											
06.5.7	ตรวจโรงงาน ตรวจแหล่งผลิต และใบรับรองตามความจำเป็น — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-07 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	25 วัน	D256	D280	P06-LAND-06(SS)											
06.5.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-08 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	9 วัน	D281	D289	P06-LAND-07; P09-TRF-003											
06.5.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-09 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	10 วัน	D290	D299	P06-LAND-08											
06.5.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-10 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	จุด	D300	D300	P06-LAND-09					◆						
วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ					10 กิจกรรม											
06.6.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-01 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	21 วัน	D180	D200	P01-PRE-NTP+179											
06.6.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-02 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	51 วัน	D195	D245	P06-D-01(SS)+14											
06.6.3	จุดอนุมัติวัสดุ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-03 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	จุด	D260	D260	P06-D-02					◆						
06.6.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-04 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	46 วัน	D230	D275	P06-D-01											
06.6.5	จัดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-05 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	จุด	D280	D280	P06-D-03; P06-D-04					◆						
06.6.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-06 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	80 วัน	D281	D360	P06-D-05											
06.6.7	ตรวจโรงงาน ตรวจแหล่งผลิต และใบรับรองตามความจำเป็น — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-07 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	25 วัน	D336	D360	P06-D-06(SS)											
06.6.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-08 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	15 วัน	D361	D375	P06-D-07; P09-TRF-003											
06.6.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-09 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	24 วัน	D376	D399	P06-D-08											
06.6.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-10 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	จุด	D400	D400	P06-D-09					◆						

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
แผนที่ 07 — แผนควบคุมคุณภาพ						24 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						3 กิจกรรม										
07.1.1	จัดทำแผนคุณภาพโครงการ วัตถุประสงค์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ P07-QA-001 · ทั้งโครงการ	30 วัน	D1	D30	P01-PRE-NTP											
07.1.2	จัดทำกรอบ ITP และรหัสจุดพักรววจ จุดร่วมตรวจ จุดทบทวน และจุดเฝ้าระวัง P07-QA-002 · ทั้งโครงการ	26 วัน	D20	D45	P07-QA-001(SS)+19											
07.1.3	จัดระบบสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการ บันทึกทดสอบ และการควบคุมตัวอย่าง P07-QA-003 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D30	D60	P07-QA-001(SS)+29											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
07.2.A.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ A P07-QA-A-PREP · พื้นที่ A	11 วัน	D145	D155	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.A.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ A P07-QA-A-MON · พื้นที่ A	761 วัน	D160	D920	P07-QA-A-PREP											
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
07.2.B.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ B P07-QA-B-PREP · พื้นที่ B	11 วัน	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.B.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ B P07-QA-B-MON · พื้นที่ B	441 วัน	D480	D920	P07-QA-B-PREP											
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
07.2.C.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ C P07-QA-C-PREP · พื้นที่ C	11 วัน	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.C.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ C P07-QA-C-MON · พื้นที่ C	461 วัน	D480	D940	P07-QA-C-PREP											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
07.2.D.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ D P07-QA-D-PREP · พื้นที่ D	11 วัน	D265	D275	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.D.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ D P07-QA-D-MON · พื้นที่ D	781 วัน	D280	D1060	P07-QA-D-PREP											
งานปิดโครงการและส่งมอบ						1 กิจกรรม										
07.3.1	ปิดงานทดสอบบูรณาการ รายการแก้ไข NCR และแฟ้มคุณภาพขั้นสุดท้าย P07-QA-COMM · งานปิดโครงการและส่งมอบ	281 วัน	D900	D1180	P07-QA-A-MON(FF); P07-QA-B-MON(FF); P07-QA-C-MON(FF); P07-QA-D-MON(FF)											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						1 กิจกรรม										
07.4.1	จุดพักรววจระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P07-A23-CEIL-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D655	D655	P01-A23-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A23-MEP1(SS)+151; P01-A23-ELE1(SS)+...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						1 กิจกรรม										
07.4.2	จุดพักรววจระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P07-A24-CEIL-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	จุด	D631	D631	P01-A24-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A24-MEP1(SS)+106; P01-A24-ELE1(SS)+...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						1 กิจกรรม										
07.4.3	จุดพักรววจระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P07-A25-CEIL-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D668	D668	P01-A25-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A25-MEP1(SS)+108; P01-A25-ELE1(SS)+...											
อาคารผลิตน้ำประปา						1 กิจกรรม										
07.4.4	จุดพักรววจระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารผลิตน้ำประปา P07-A26-CEIL-HOLD · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D670	D670	P01-A26-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A26-MEP1(SS)+99; P01-A26-ELE1(SS)+9...											

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งานงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต


ต่อ: แผนที่ 07 — แผนควบคุมคุณภาพ · อาคารผลิตน้ำประปา

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
07.4.5	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P07-A29-CEIL-HOLD · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	จุด	D778	D778	P01-A29-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A29-MEP1(SS)+50; P01-A29-ELE1(SS)+4...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
07.4.6	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P07-B31-CEIL-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D687	D687	P01-B31-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B31-MEP1(SS)+60; P01-B31-ELE1(SS)+5...											
อาคารขยะ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
07.4.7	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารขยะ พื้นที่ B P07-B32-CEIL-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D671	D671	P01-B32-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B32-MEP1(SS)+48; P01-B32-ELE1(SS)+4...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
07.4.8	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P07-C41-CEIL-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D722	D722	P01-C41-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C41-MEP1(SS)+65; P01-C41-ELE1(SS)+6...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						1 กิจกรรม										
07.4.9	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P07-C42A-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D707	D707	P01-C42A-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C42A-MEP1(SS)+60; P01-C42A-ELE1(SS)...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						1 กิจกรรม										
07.4.10	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P07-C42B-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D757	D757	P01-C42B-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C42B-MEP1(SS)+60; P01-C42B-ELE1(SS)...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						1 กิจกรรม										
07.4.11	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P07-C42C-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D807	D807	P01-C42C-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C42C-MEP1(SS)+60; P01-C42C-ELE1(SS)...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
07.4.12	จุดพักรวบรวมระบบเหนือฝาก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P07-C43-CEIL-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D801	D801	P01-C43-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C43-MEP1(SS)+48; P01-C43-ELE1(SS)+4...											
แผนที่ 08 — แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						61 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						5 กิจกรรม										
08.1.1	จัดทำแผนความปลอดภัย ทะเบียนความเสี่ยง และโครงสร้างตอบโต้เหตุฉุกเฉิน P08-HSE-001 · ทั้งโครงการ	30 วัน	D1	D30	P01-PRE-NTP											
08.1.2	จัดระบบปฐมนิเทศ สมรรถนะ การประชุมชี้แจงก่อนเริ่มงาน และสิทธิหยุดงาน P08-HSE-002 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D15	D45	P08-HSE-001(SS)+14											
08.1.3	จัดระบบใบอนุญาตทำงานสำหรับงานขุด งานบนที่สูง งานยก LOTO งานร้อน ที่อับอากาศ และงานใกล้น้ำ P08-HSE-003 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D30	D60	P08-HSE-001(SS)+29											
08.1.4	เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน ระบบกู้ภัย การสื่อสาร และฝึกซ้อมครั้งแรก P08-HSE-004 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D45	D75	P08-HSE-002(SS)+29											
08.3.1	ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นระยะ: อัคคีภัย ไฟป่า บาดเจ็บ สารหก น้ำหลาก งานใกล้น้ำ และอพยพ P08-HSE-DRILLS · ทั้งโครงการ	900 วัน	D181	D1080	P08-HSE-004											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
08.2.A.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ A P08-HSE-A-MON · พื้นที่ A	761 วัน	D160	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.A.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ A P08-HSE-A-REL · พื้นที่ A	8 วัน	D148	D155	P08-HSE-003											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
08.2.B.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ B P08-HSE-B-MON · พื้นที่ B	441 วัน	D480	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.B.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ B P08-HSE-B-REL · พื้นที่ B	8 วัน	D468	D475	P08-HSE-003											
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
08.2.C.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ C P08-HSE-C-MON · พื้นที่ C	461 วัน	D480	D940	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.C.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ C P08-HSE-C-REL · พื้นที่ C	8 วัน	D468	D475	P08-HSE-003											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
08.2.D.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ D P08-HSE-D-MON · พื้นที่ D	781 วัน	D280	D1060	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.D.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ D P08-HSE-D-REL · พื้นที่ D	8 วัน	D268	D275	P08-HSE-003											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 กิจกรรม										
08.4.1	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P08-A23-EARTH-PTW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D201	D201	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL											
08.4.23	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P08-A23-WAH · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D481	D481	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23-FRM(SS)+89											
08.4.35	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P08-A23-LOTO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D774	D774	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23-ELE2(SS)+63											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 กิจกรรม										
08.4.2	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P08-A24-EARTH-PTW · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	จุด	D314	D314	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL											
08.4.24	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P08-A24-WAH · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	จุด	D509	D509	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24-FRM(SS)+62											
08.4.36	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P08-A24-LOTO · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	จุด	D714	D714	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24-ELE2(SS)+44											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 กิจกรรม										
08.4.3	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P08-A25-EARTH-PTW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D344	D344	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL											
08.4.25	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P08-A25-WAH · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D544	D544	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25-FRM(SS)+64											
08.4.37	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P08-A25-LOTO · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D753	D753	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25-ELE2(SS)+45											
อาคารผลิตน้ำประปา						3 กิจกรรม										
08.4.4	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-EARTH-PTW · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D373	D373	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL											
08.4.26	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-WAH · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D556	D556	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26-FRM(SS)+58											
08.4.38	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-LOTO · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D747	D747	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26-ELE2(SS)+41											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						3 กิจกรรม										
08.4.5	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-EARTH-PTW · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D627	D627	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL						◆					
08.4.27	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-WAH · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D720	D720	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29-FRM(SS)+30							◆				
08.4.39	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-LOTO · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D818	D818	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29-ELE2(SS)+21								◆			
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.6	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-EARTH-PTW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D508	D508	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL					◆						
08.4.28	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-WAH · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D618	D618	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31-FRM(SS)+35						◆					
08.4.40	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-LOTO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D734	D734	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31-ELE2(SS)+25							◆				
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.7	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-EARTH-PTW · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D526	D526	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL					◆						
08.4.29	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-WAH · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D616	D616	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32-FRM(SS)+29						◆					
08.4.41	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-LOTO · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D709	D709	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32-ELE2(SS)+20							◆				
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 กิจกรรม										
08.4.8	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-EARTH-PTW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D528	D528	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL					◆						
08.4.30	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-WAH · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D647	D647	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41-FRM(SS)+37						◆					
08.4.42	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-LOTO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D772	D772	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41-ELE2(SS)+27								◆			
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						3 กิจกรรม										
08.4.9	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D528	D528	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL					◆						
08.4.31	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D638	D638	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42A-FRM(SS)+35						◆					
08.4.43	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D754	D754	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42A-ELE2(SS)+25								◆			
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						3 กิจกรรม										
08.4.10	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D578	D578	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL					◆						
08.4.32	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D688	D688	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42B-FRM(SS)+35							◆				
08.4.44	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D804	D804	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42B-ELE2(SS)+25								◆			
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						3 กิจกรรม										
08.4.11	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D628	D628	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL						◆					

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	1200
08.4.33	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D738	D738	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42C-FRM(SS)+35													◆							
08.4.45	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D854	D854	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C42C-ELE2(SS)+25														◆						
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C					3 กิจกรรม																				
08.4.12	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-EARTH-PTW · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D656	D656	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL											◆									
08.4.34	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-WAH · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D746	D746	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43-FRM(SS)+29													◆							
08.4.46	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-LOTO · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D839	D839	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43-ELE2(SS)+20														◆						
โชนทางเข้า–ออกหลัก					1 กิจกรรม				I																
08.4.13	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — โชนทางเข้า–ออกหลัก P08-A21-EARTH-PTW · โชนทางเข้า–ออกหลัก	จุด	D199	D199	P01-A21-REL; P08-HSE-A-REL			◆																	
จุดรับส่งผู้โดยสาร					1 กิจกรรม				I																
08.4.14	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — จุดรับส่งผู้โดยสาร P08-A22-EARTH-PTW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D238	D238	P01-A22-REL; P08-HSE-A-REL				◆																
สนามหญ้าอ่อนกประสงค์					1 กิจกรรม										I										
08.4.15	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — สนามหญ้าอ่อนกประสงค์ P08-A27-EARTH-PTW · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	จุด	D544	D544	P01-A27-REL; P08-HSE-A-REL									◆											
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A					1 กิจกรรม												I								
08.4.16	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P08-A28-EARTH-PTW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D676	D676	P01-A28-REL; P08-HSE-A-REL											◆									
ลานจอดรถ พื้นที่ B					1 กิจกรรม										I										
08.4.17	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — ลานจอดรถ พื้นที่ B P08-B33-EARTH-PTW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D526	D526	P01-B33-REL; P08-HSE-B-REL									◆											
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B					1 กิจกรรม													I							
08.4.18	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P08-B34-EARTH-PTW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D734	D734	P01-B34-REL; P08-HSE-B-REL													◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1					1 กิจกรรม					I															
08.4.19	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P08-D51-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D327	D327	P01-D51-REL; P08-HSE-D-REL					◆															
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2					1 กิจกรรม							I													
08.4.20	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P08-D52-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	จุด	D458	D458	P01-D52-REL; P08-HSE-D-REL						◆														
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3					1 กิจกรรม												I								
08.4.21	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P08-D53-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	จุด	D629	D629	P01-D53-REL; P08-HSE-D-REL											◆									
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D					1 กิจกรรม													I							
08.4.22	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตทำงานขุดหรืองานดิน — ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P08-D54-EARTH-PTW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	จุด	D786	D786	P01-D54-REL; P08-HSE-D-REL													◆							

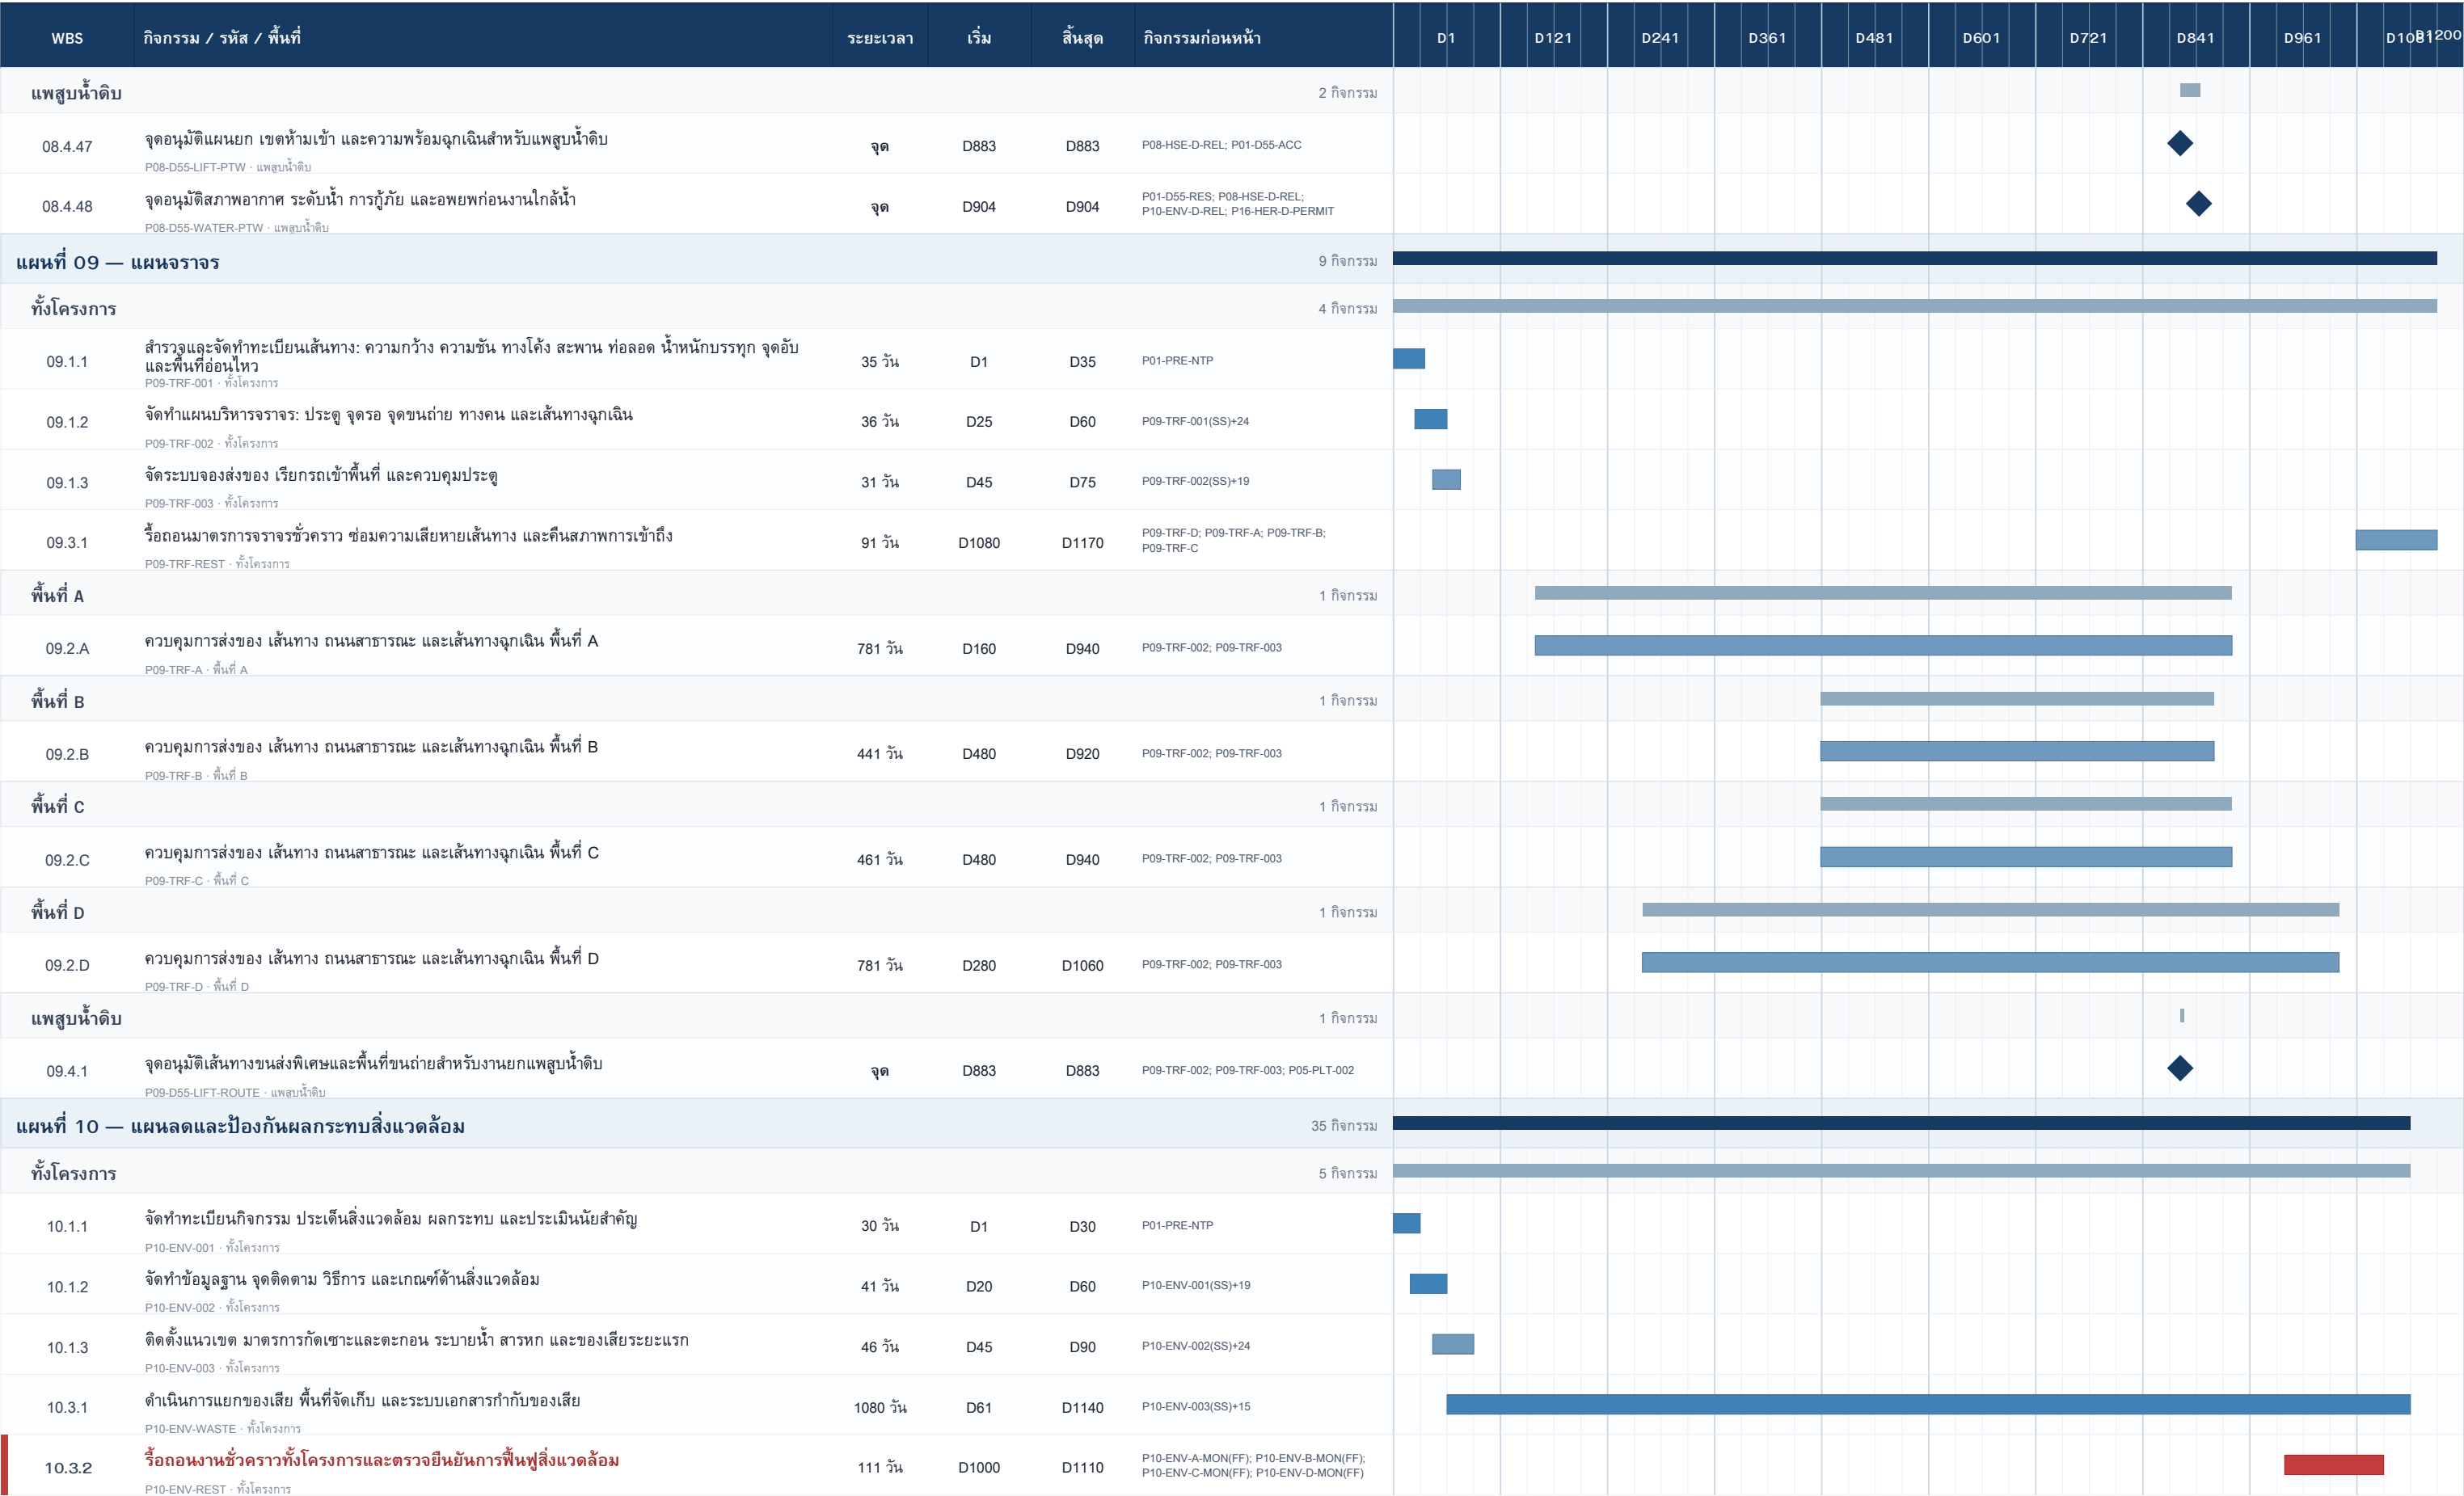

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200				
พื้นที่ A						2 กิจกรรม														
10.2.A.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ A P10-ENV-A-MON · พื้นที่ A	761 วัน	D160	D920	P10-ENV-003															
10.2.A.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ A P10-ENV-A-REL · พื้นที่ A	10 วัน	D145	D154	P10-ENV-003															
พื้นที่ B						2 กิจกรรม														
10.2.B.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ B P10-ENV-B-MON · พื้นที่ B	441 วัน	D480	D920	P10-ENV-003															
10.2.B.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ B P10-ENV-B-REL · พื้นที่ B	10 วัน	D465	D474	P10-ENV-003															
พื้นที่ C						2 กิจกรรม														
10.2.C.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ C P10-ENV-C-MON · พื้นที่ C	461 วัน	D480	D940	P10-ENV-003															
10.2.C.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ C P10-ENV-C-REL · พื้นที่ C	10 วัน	D465	D474	P10-ENV-003															
พื้นที่ D						2 กิจกรรม														
10.2.D.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ D P10-ENV-D-MON · พื้นที่ D	781 วัน	D280	D1060	P10-ENV-003															
10.2.D.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ D P10-ENV-D-REL · พื้นที่ D	10 วัน	D265	D274	P10-ENV-003															
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						1 กิจกรรม														
10.4.1	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P10-A23-EARTH-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D201	D201	P01-A23-REL; P10-ENV-A-REL															
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						1 กิจกรรม														
10.4.2	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P10-A24-EARTH-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	จุด	D314	D314	P01-A24-REL; P10-ENV-A-REL															
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						1 กิจกรรม														
10.4.3	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P10-A25-EARTH-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D344	D344	P01-A25-REL; P10-ENV-A-REL															
อาคารผลิตน้ำประปา						1 กิจกรรม														
10.4.4	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารผลิตน้ำประปา P10-A26-EARTH-ENV · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D373	D373	P01-A26-REL; P10-ENV-A-REL															
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A						1 กิจกรรม														
10.4.5	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A P10-A29-EARTH-ENV · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	จุด	D627	D627	P01-A29-REL; P10-ENV-A-REL															
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						1 กิจกรรม														
10.4.6	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P10-B31-EARTH-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D508	D508	P01-B31-REL; P10-ENV-B-REL															
อาคารขยะ พื้นที่ B						1 กิจกรรม														
10.4.7	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารขยะ พื้นที่ B P10-B32-EARTH-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D526	D526	P01-B32-REL; P10-ENV-B-REL															

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081200
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						1 กิจกรรม									
10.4.8	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P10-C41-EARTH-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D528	D528	P01-C41-REL; P10-ENV-C-REL					◆					
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						1 กิจกรรม									
10.4.9	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P10-C42A-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D528	D528	P01-C42A-REL; P10-ENV-C-REL					◆					
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						1 กิจกรรม									
10.4.10	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P10-C42B-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D578	D578	P01-C42B-REL; P10-ENV-C-REL					◆					
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						1 กิจกรรม									
10.4.11	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P10-C42C-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D628	D628	P01-C42C-REL; P10-ENV-C-REL						◆				
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						1 กิจกรรม									
10.4.12	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P10-C43-EARTH-ENV · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D656	D656	P01-C43-REL; P10-ENV-C-REL						◆				
โซนทางเข้า–ออกหลัก						1 กิจกรรม									
10.4.13	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — โซนทางเข้า–ออกหลัก P10-A21-EARTH-ENV · โซนทางเข้า–ออกหลัก	จุด	D199	D199	P01-A21-REL; P10-ENV-A-REL		◆								
จุดรับส่งผู้โดยสาร						1 กิจกรรม									
10.4.14	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — จุดรับส่งผู้โดยสาร P10-A22-EARTH-ENV · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D238	D238	P01-A22-REL; P10-ENV-A-REL		◆								
สนามหญ้าอเนกประสงค์						1 กิจกรรม									
10.4.15	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P10-A27-EARTH-ENV · สนามหญ้าอเนกประสงค์	จุด	D544	D544	P01-A27-REL; P10-ENV-A-REL					◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						1 กิจกรรม									
10.4.16	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P10-A28-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D676	D676	P01-A28-REL; P10-ENV-A-REL						◆				
ลานจอดรถ พื้นที่ B						1 กิจกรรม									
10.4.17	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ลานจอดรถ พื้นที่ B P10-B33-EARTH-ENV · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D526	D526	P01-B33-REL; P10-ENV-B-REL					◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						1 กิจกรรม									
10.4.18	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P10-B34-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D734	D734	P01-B34-REL; P10-ENV-B-REL							◆			
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						1 กิจกรรม									
10.4.19	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P10-D51-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D327	D327	P01-D51-REL; P10-ENV-D-REL			◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						1 กิจกรรม									
10.4.20	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P10-D52-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	จุด	D458	D458	P01-D52-REL; P10-ENV-D-REL			◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						1 กิจกรรม									
10.4.21	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P10-D53-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	จุด	D629	D629	P01-D53-REL; P10-ENV-D-REL						◆				

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต


ต่อ: แผนที่ 10 — แผนลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						1 กิจกรรม						I				
10.4.22	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P10-D54-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	จุด	D786	D786	P01-D54-REL; P10-ENV-D-REL							◆				
แผนที่ 11 — แผนบริหารจัดการเอกสารโครงการ						89 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						9 กิจกรรม										
11.1.1	กำหนดรหัสเอกสาร ข้อมูลกำกับเอกสาร และข้อกำหนด ขั้นตอนการทำงาน P11-CDE-001 · ทั้งโครงการ	20 วัน	D1	D20	P01-PRE-NTP	■										
11.1.2	กำหนดบทบาท ทะเบียน และขั้นตอนส่งเอกสารใน CDE/EDMS P11-CDE-002 · ทั้งโครงการ	31 วัน	D15	D45	P11-CDE-001(SS)+14	■										
11.1.3	ทดสอบการแก้ไข อนุมัติ ยกเลิกฉบับ และ ประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง P11-CDE-003 · ทั้งโครงการ	21 วัน	D40	D60	P11-CDE-002(SS)+25	■										
11.1.4	จุดอนุมัติเปิดใช้งานระบบ CDE/EDMS P11-CDE-004 · ทั้งโครงการ	จุด	D61	D61	P11-CDE-003	◆										
11.2.CO	รอบควบคุมเอกสารปิดโครงการและส่งมอบ P11-CDE-CO · ทั้งโครงการ	300 วัน	D901	D1200	P11-CDE-004; P11-CDE-PRE(FF); P11-CDE-ZA(FF); P11-CDE-ZBC(FF); P11-CDE-ZD(FF)											
11.2.PRE	รอบควบคุมเอกสารช่วงก่อนก่อสร้าง P11-CDE-PRE · ทั้งโครงการ	120 วัน	D61	D180	P11-CDE-004	■	■									
11.2.ZA	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ A P11-CDE-ZA · ทั้งโครงการ	660 วัน	D181	D840	P11-CDE-004			■	■	■	■	■	■	■	■	■
11.2.ZBC	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ B/C P11-CDE-ZBC · ทั้งโครงการ	600 วัน	D301	D900	P11-CDE-004				■	■	■	■	■	■	■	■
11.2.ZD	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ D P11-CDE-ZD · ทั้งโครงการ	740 วัน	D301	D1040	P11-CDE-004				■	■	■	■	■	■	■	■
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						4 กิจกรรม										
11.4.001	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P11-A23-STR-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D283	D283	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+207; P01-PRE-DES			◆								
11.4.002	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P11-A23-ARC-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D491	D491	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+415; P01-PRE-DES					◆						
11.4.003	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P11-A23-MEP-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D504	D504	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+428; P01-PRE-DES					◆						
11.4.004	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P11-A23-TST-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	จุด	D774	D774	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+698; P01-PRE-DES							◆				
อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ						4 กิจกรรม										
11.4.005	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P11-A24-STR-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D371	D371	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+295; P01-PRE-DES				◆							
11.4.006	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P11-A24-ARC-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D516	D516	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+440; P01-PRE-DES					◆						
11.4.007	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P11-A24-MEP-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D525	D525	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+449; P01-PRE-DES					◆						
11.4.008	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P11-A24-TST-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	จุด	D714	D714	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+638; P01-PRE-DES						◆					
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						4 กิจกรรม										
11.4.009	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P11-A25-STR-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D403	D403	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+327; P01-PRE-DES				◆							
11.4.010	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P11-A25-ARC-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D551	D551	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+475; P01-PRE-DES					◆						

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
11.4.011	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P11-A25-MEP-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+484; P01-PRE-DES									◆											
11.4.012	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P11-A25-TST-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	จุด	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+677; P01-PRE-DES													◆							
อาคารผลิตน้ำประปา					4 กิจกรรม																				
11.4.013	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-STR-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D427	D427	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+351; P01-PRE-DES							◆													
11.4.014	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-ARC-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D562	D562	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+486; P01-PRE-DES									◆											
11.4.015	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-MEP-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D571	D571	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+495; P01-PRE-DES									◆											
11.4.016	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-TST-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	จุด	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+671; P01-PRE-DES													◆							
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A					4 กิจกรรม																				
11.4.017	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-STR-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D654	D654	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+578; P01-PRE-DES											◆									
11.4.018	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-ARC-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+647; P01-PRE-DES													◆							
11.4.019	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-MEP-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D728	D728	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+652; P01-PRE-DES													◆							
11.4.020	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-TST-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	จุด	D818	D818	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+742; P01-PRE-DES														◆						
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B					4 กิจกรรม																				
11.4.021	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-STR-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D540	D540	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+239; P01-PRE-DES									◆											
11.4.022	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-ARC-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D622	D622	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+321; P01-PRE-DES											◆									
11.4.023	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-MEP-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D627	D627	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+326; P01-PRE-DES											◆									
11.4.024	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-TST-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	จุด	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+433; P01-PRE-DES													◆							
อาคารขยะ พื้นที่ B					4 กิจกรรม																				
11.4.025	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-STR-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D553	D553	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+252; P01-PRE-DES									◆											
11.4.026	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-ARC-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D619	D619	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+318; P01-PRE-DES											◆									
11.4.027	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-MEP-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D623	D623	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+322; P01-PRE-DES											◆									
11.4.028	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-TST-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	จุด	D709	D709	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+408; P01-PRE-DES													◆							
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C					4 กิจกรรม																				
11.4.029	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-STR-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D563	D563	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+262; P01-PRE-DES									◆											
11.4.030	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-ARC-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D652	D652	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+351; P01-PRE-DES											◆									
11.4.031	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-MEP-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D657	D657	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+356; P01-PRE-DES											◆									

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
11.4.032	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-TST-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	จุด	D772	D772	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+471; P01-PRE-DES													◆							
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1					4 กิจกรรม																				
11.4.033	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+259; P01-PRE-DES									◆											
11.4.034	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D642	D642	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+341; P01-PRE-DES												◆								
11.4.035	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D647	D647	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+346; P01-PRE-DES												◆								
11.4.036	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	จุด	D754	D754	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+453; P01-PRE-DES													◆							
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2					4 กิจกรรม																				
11.4.037	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D610	D610	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+309; P01-PRE-DES												◆								
11.4.038	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D692	D692	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+391; P01-PRE-DES													◆							
11.4.039	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D697	D697	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+396; P01-PRE-DES													◆							
11.4.040	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	จุด	D804	D804	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+503; P01-PRE-DES														◆						
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3					4 กิจกรรม																				
11.4.041	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D660	D660	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+359; P01-PRE-DES												◆								
11.4.042	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D742	D742	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+441; P01-PRE-DES													◆							
11.4.043	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+446; P01-PRE-DES													◆							
11.4.044	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	จุด	D854	D854	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+553; P01-PRE-DES														◆						
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C					4 กิจกรรม																				
11.4.045	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-STR-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D683	D683	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+382; P01-PRE-DES												◆								
11.4.046	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-ARC-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D749	D749	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+448; P01-PRE-DES													◆							
11.4.047	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-MEP-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+452; P01-PRE-DES													◆							
11.4.048	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-TST-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	จุด	D839	D839	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM-C-COORD(SS)+538; P01-PRE-DES														◆						
โซนทางเข้า-ออกหลัก					3 กิจกรรม																				
11.4.049	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — โซนทางเข้า-ออกหลัก P11-A21-CIV-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	จุด	D199	D199	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+123; P01-PRE-DES(S...				◆																
11.4.050	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — โซนทางเข้า-ออกหลัก P11-A21-UTIL-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	จุด	D229	D229	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+153; P01-PRE-DES(S...					◆															
11.4.051	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — โซนทางเข้า-ออกหลัก P11-A21-LAND-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	จุด	D286	D286	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+210; P01-PRE-DES						◆														


WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
จุดรับส่งผู้โดยสาร						3 กิจกรรม										
11.4.052	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-CIV-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D238	D238	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+162; P01-PRE-DES(S...			◆								
11.4.053	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-UTIL-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D268	D268	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+192; P01-PRE-DES(S...			◆								
11.4.054	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-LAND-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	จุด	D326	D326	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+250; P01-PRE-DES			◆								
สนามหญ้าอเนกประสงค์						3 กิจกรรม										
11.4.055	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-CIV-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	จุด	D544	D544	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+468; P01-PRE-DES					◆						
11.4.056	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-UTIL-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	จุด	D586	D586	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+510; P01-PRE-DES					◆						
11.4.057	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-LAND-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	จุด	D664	D664	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+588; P01-PRE-DES						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						3 กิจกรรม										
11.4.058	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D676	D676	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+600; P01-PRE-DES						◆					
11.4.059	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+647; P01-PRE-DES							◆				
11.4.060	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	จุด	D808	D808	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM-A-COORD(SS)+732; P01-PRE-DES								◆			
ลานจอดรถ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
11.4.061	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-CIV-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D526	D526	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+225; P01-PRE-DES					◆						
11.4.062	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-UTIL-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D573	D573	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+272; P01-PRE-DES					◆						
11.4.063	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-LAND-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	จุด	D658	D658	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+357; P01-PRE-DES						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
11.4.064	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+433; P01-PRE-DES							◆				
11.4.065	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D760	D760	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+459; P01-PRE-DES								◆			
11.4.066	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	จุด	D806	D806	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM-B-COORD(SS)+505; P01-PRE-DES									◆		
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						3 กิจกรรม										
11.4.067	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D327	D327	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM-D-COORD(SS)+26; P01-PRE-DES			◆								
11.4.068	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D400	D400	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM-D-COORD(SS)+99; P01-PRE-DES				◆							
11.4.069	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	จุด	D454	D454	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM-D-COORD(SS)+153; P01-PRE-DES				◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						3 กิจกรรม										
11.4.070	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P11-D52-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	จุด	D458	D458	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM-D-COORD(SS)+157; P01-PRE-DES				◆							

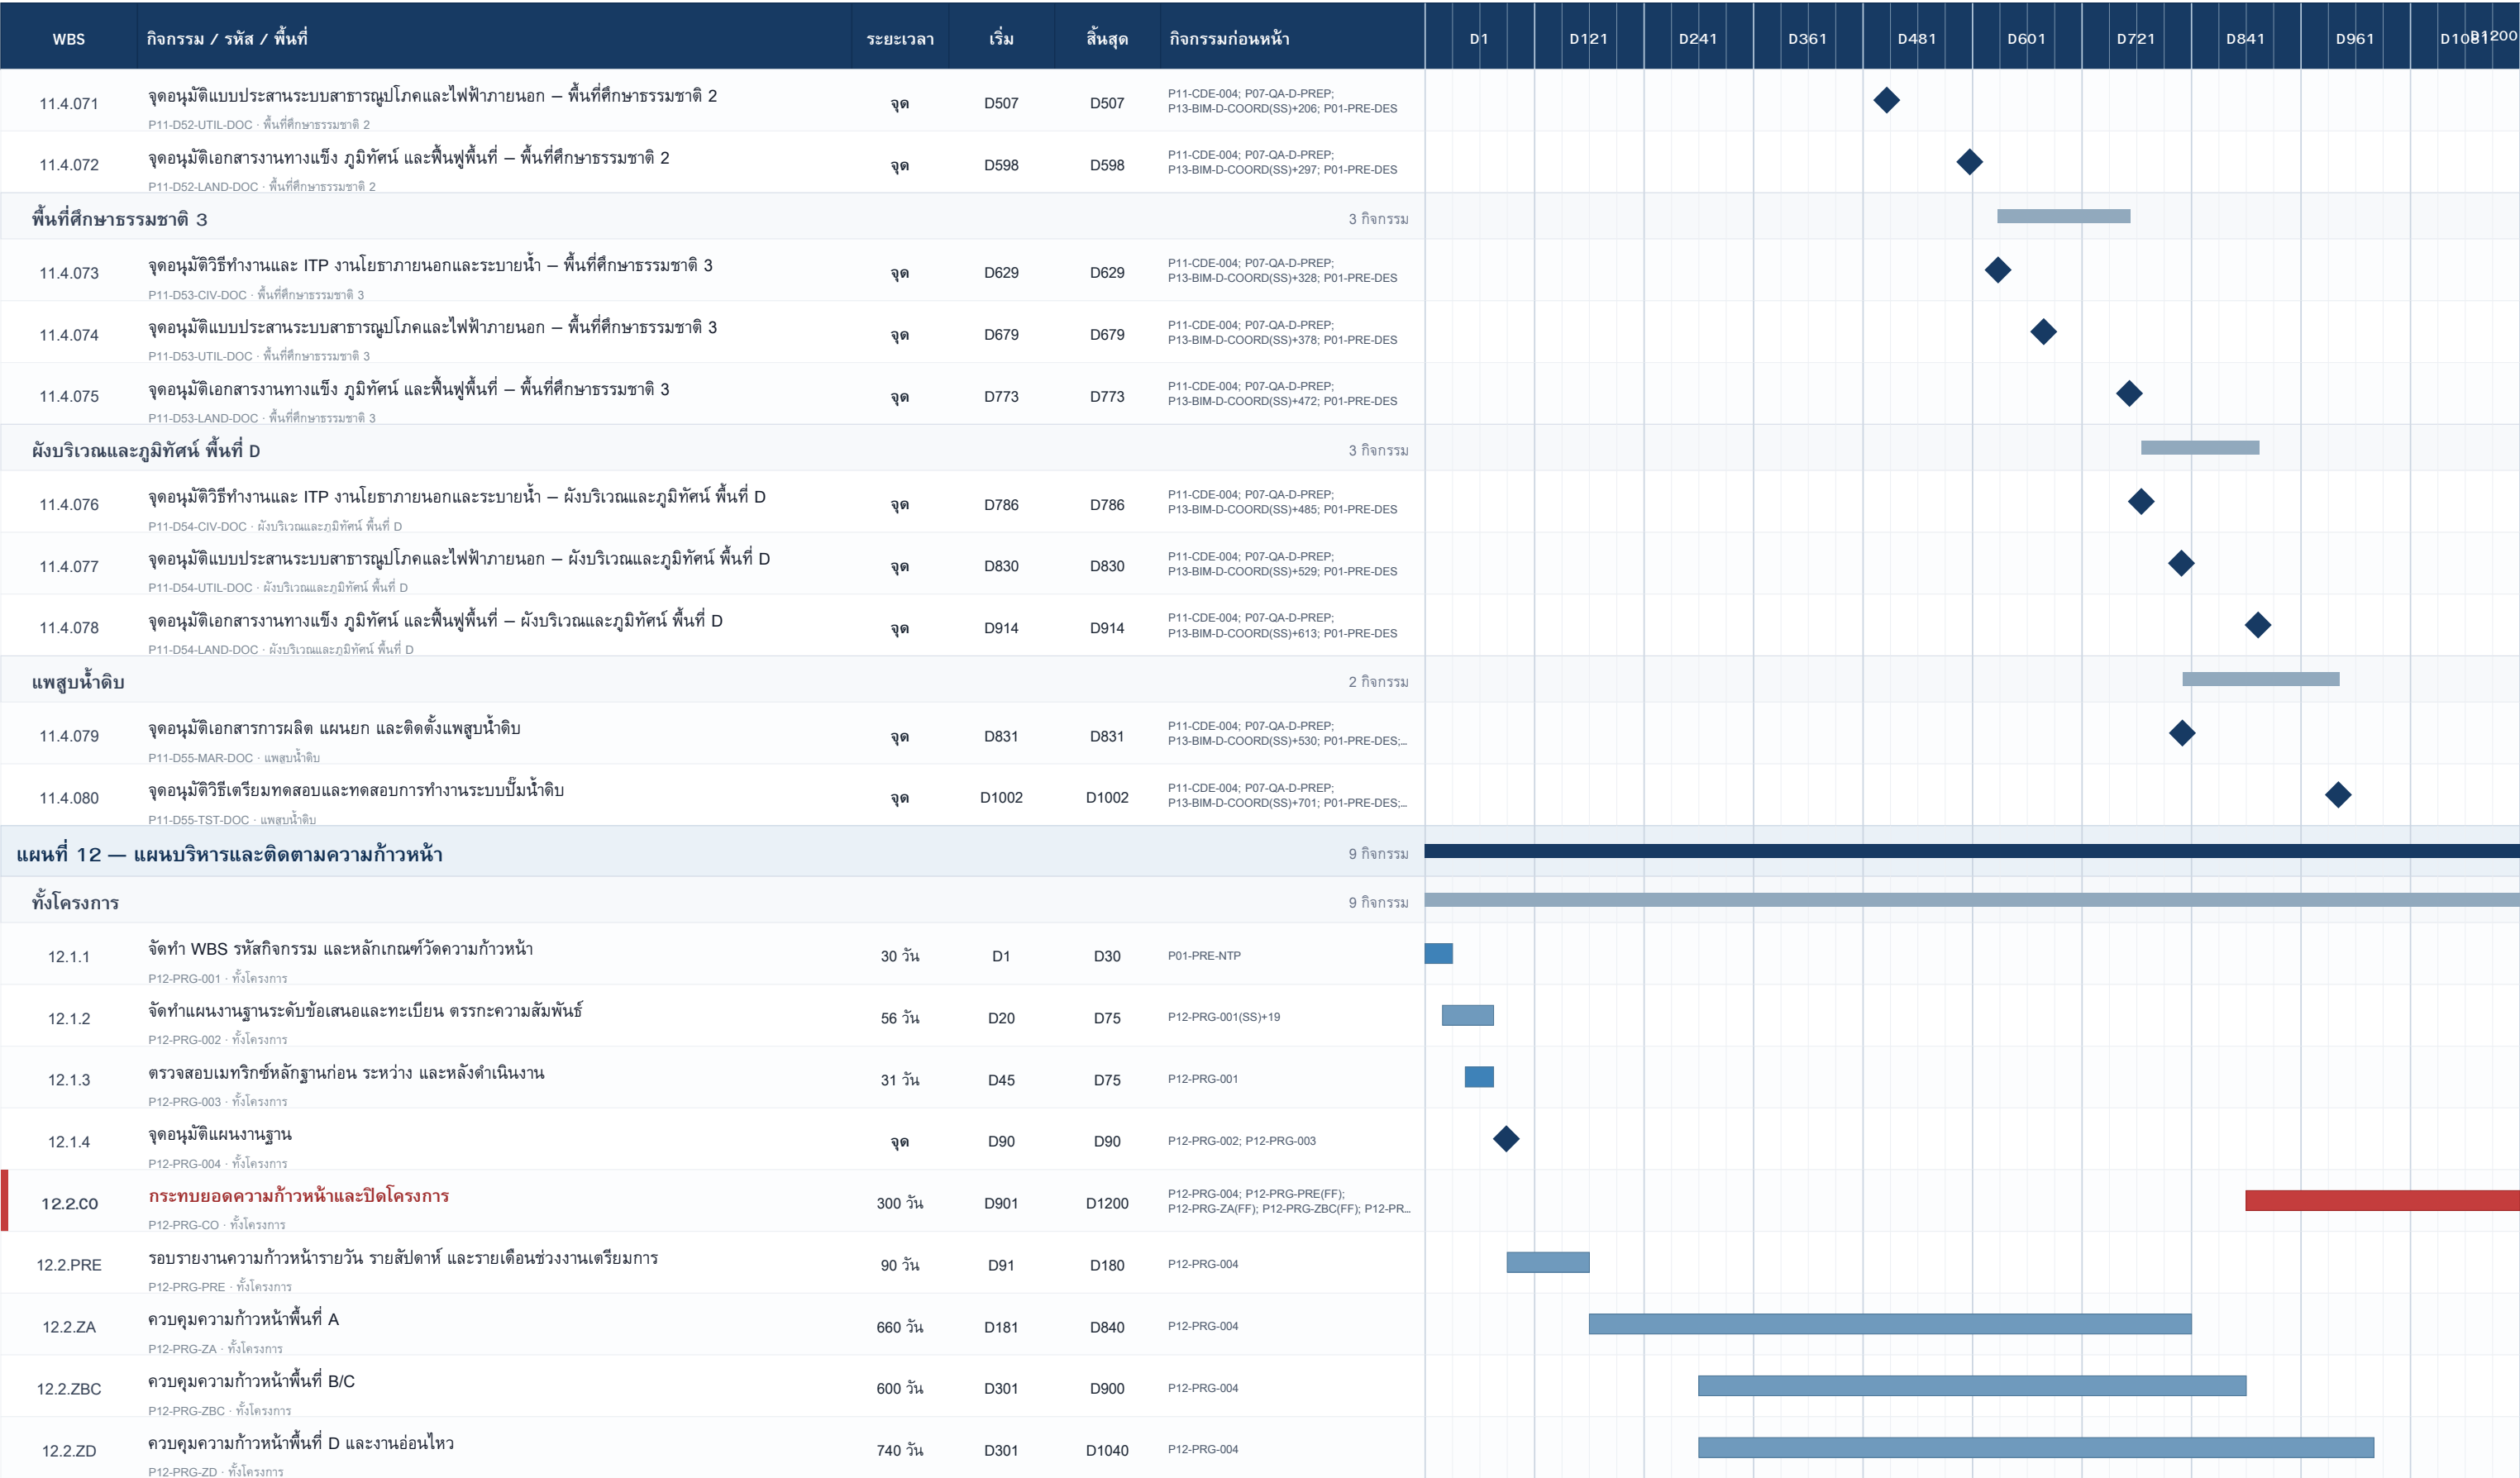

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
แผนที่ 13 — แผนการใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร						16 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม										
13.1.1	ประเมินความพร้อม BIM ด้านบุคลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ CDE และรูปแบบแลกเปลี่ยนข้อมูล P13-BIM-001 · ทั้งโครงการ	25 วัน	D1	D25	P01-PRE-NTP											
13.1.2	จัดทำแผนดำเนินงาน BIM การตั้งชื่อ การจำแนก และหน้าที่รับผิดชอบ P13-BIM-002 · ทั้งโครงการ	36 วัน	D15	D50	P13-BIM-001(SS)+14											
13.1.3	จัดทำ MIDP/TIDP และแผนส่งมอบแบบจำลอง P13-BIM-003 · ทั้งโครงการ	26 วัน	D35	D60	P13-BIM-002(SS)+19											
13.1.4	ทดสอบสภาพแวดล้อม BIM การแลกเปลี่ยนแบบจำลอง และการรวมแบบ P13-BIM-004 · ทั้งโครงการ	26 วัน	D50	D75	P13-BIM-003(SS)+14; P11-CDE-004(FF)											
13.1.5	จุดอนุมัติเริ่มผลิตแบบจำลอง BIM P13-BIM-005 · ทั้งโครงการ	จุด	D76	D76	P13-BIM-004											
13.3.1	ตรวจสอบผลงานและปรับปรุง BIM ตามสภาพก่อสร้างจริงอย่างต่อเนื่อง P13-BIM-ASB · ทั้งโครงการ	541 วัน	D600	D1140	P13-BIM-005; P13-BIM-A-COORD(FF); P13-BIM-A-4D(FF); P13-BIM-B-COORD(FF); P...											
13.4.1	เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศทรัพย์สินและ แบบจำลองดิจิทัลของสินทรัพย์ P13-BIM-AIM · ทั้งโครงการ	271 วัน	D900	D1170	P13-BIM-ASB(SS)+299											
13.4.2	จุดส่งมอบ BIM, AIM และ แบบจำลองดิจิทัลของสินทรัพย์ P13-BIM-HO · ทั้งโครงการ	จุด	D1180	D1180	P13-BIM-AIM											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
13.2.A.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ A P13-BIM-A-COORD · พื้นที่ A	765 วัน	D76	D840	P13-BIM-005											
13.2.A.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระแทบยอด พื้นที่ A P13-BIM-A-4D · พื้นที่ A	751 วัน	D90	D840	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
13.2.B.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ B P13-BIM-B-COORD · พื้นที่ B	600 วัน	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.B.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระแทบยอด พื้นที่ B P13-BIM-B-4D · พื้นที่ B	600 วัน	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
13.2.C.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ C P13-BIM-C-COORD · พื้นที่ C	600 วัน	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.C.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระแทบยอด พื้นที่ C P13-BIM-C-4D · พื้นที่ C	600 วัน	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
13.2.D.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ D P13-BIM-D-COORD · พื้นที่ D	740 วัน	D301	D1040	P13-BIM-005											
13.2.D.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระแทบยอด พื้นที่ D P13-BIM-D-4D · พื้นที่ D	740 วัน	D301	D1040	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
แผนที่ 14 — แผนการใช้โปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์						9 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม										
14.1.1	สำรวจความต้องการ กรณีใช้งาน กระบวนการ ข้อมูล และเกณฑ์ยอมรับ P14-AI-001 · ทั้งโครงการ	35 วัน	D1	D35	P01-PRE-NTP											
14.1.2	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การไหลข้อมูล UX, API และความมั่นคงปลอดภัย P14-AI-002 · ทั้งโครงการ	36 วัน	D25	D60	P14-AI-001(SS)+24											

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งวดงาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 14 — แผนการใช้โปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ · ทั้งโครงการ

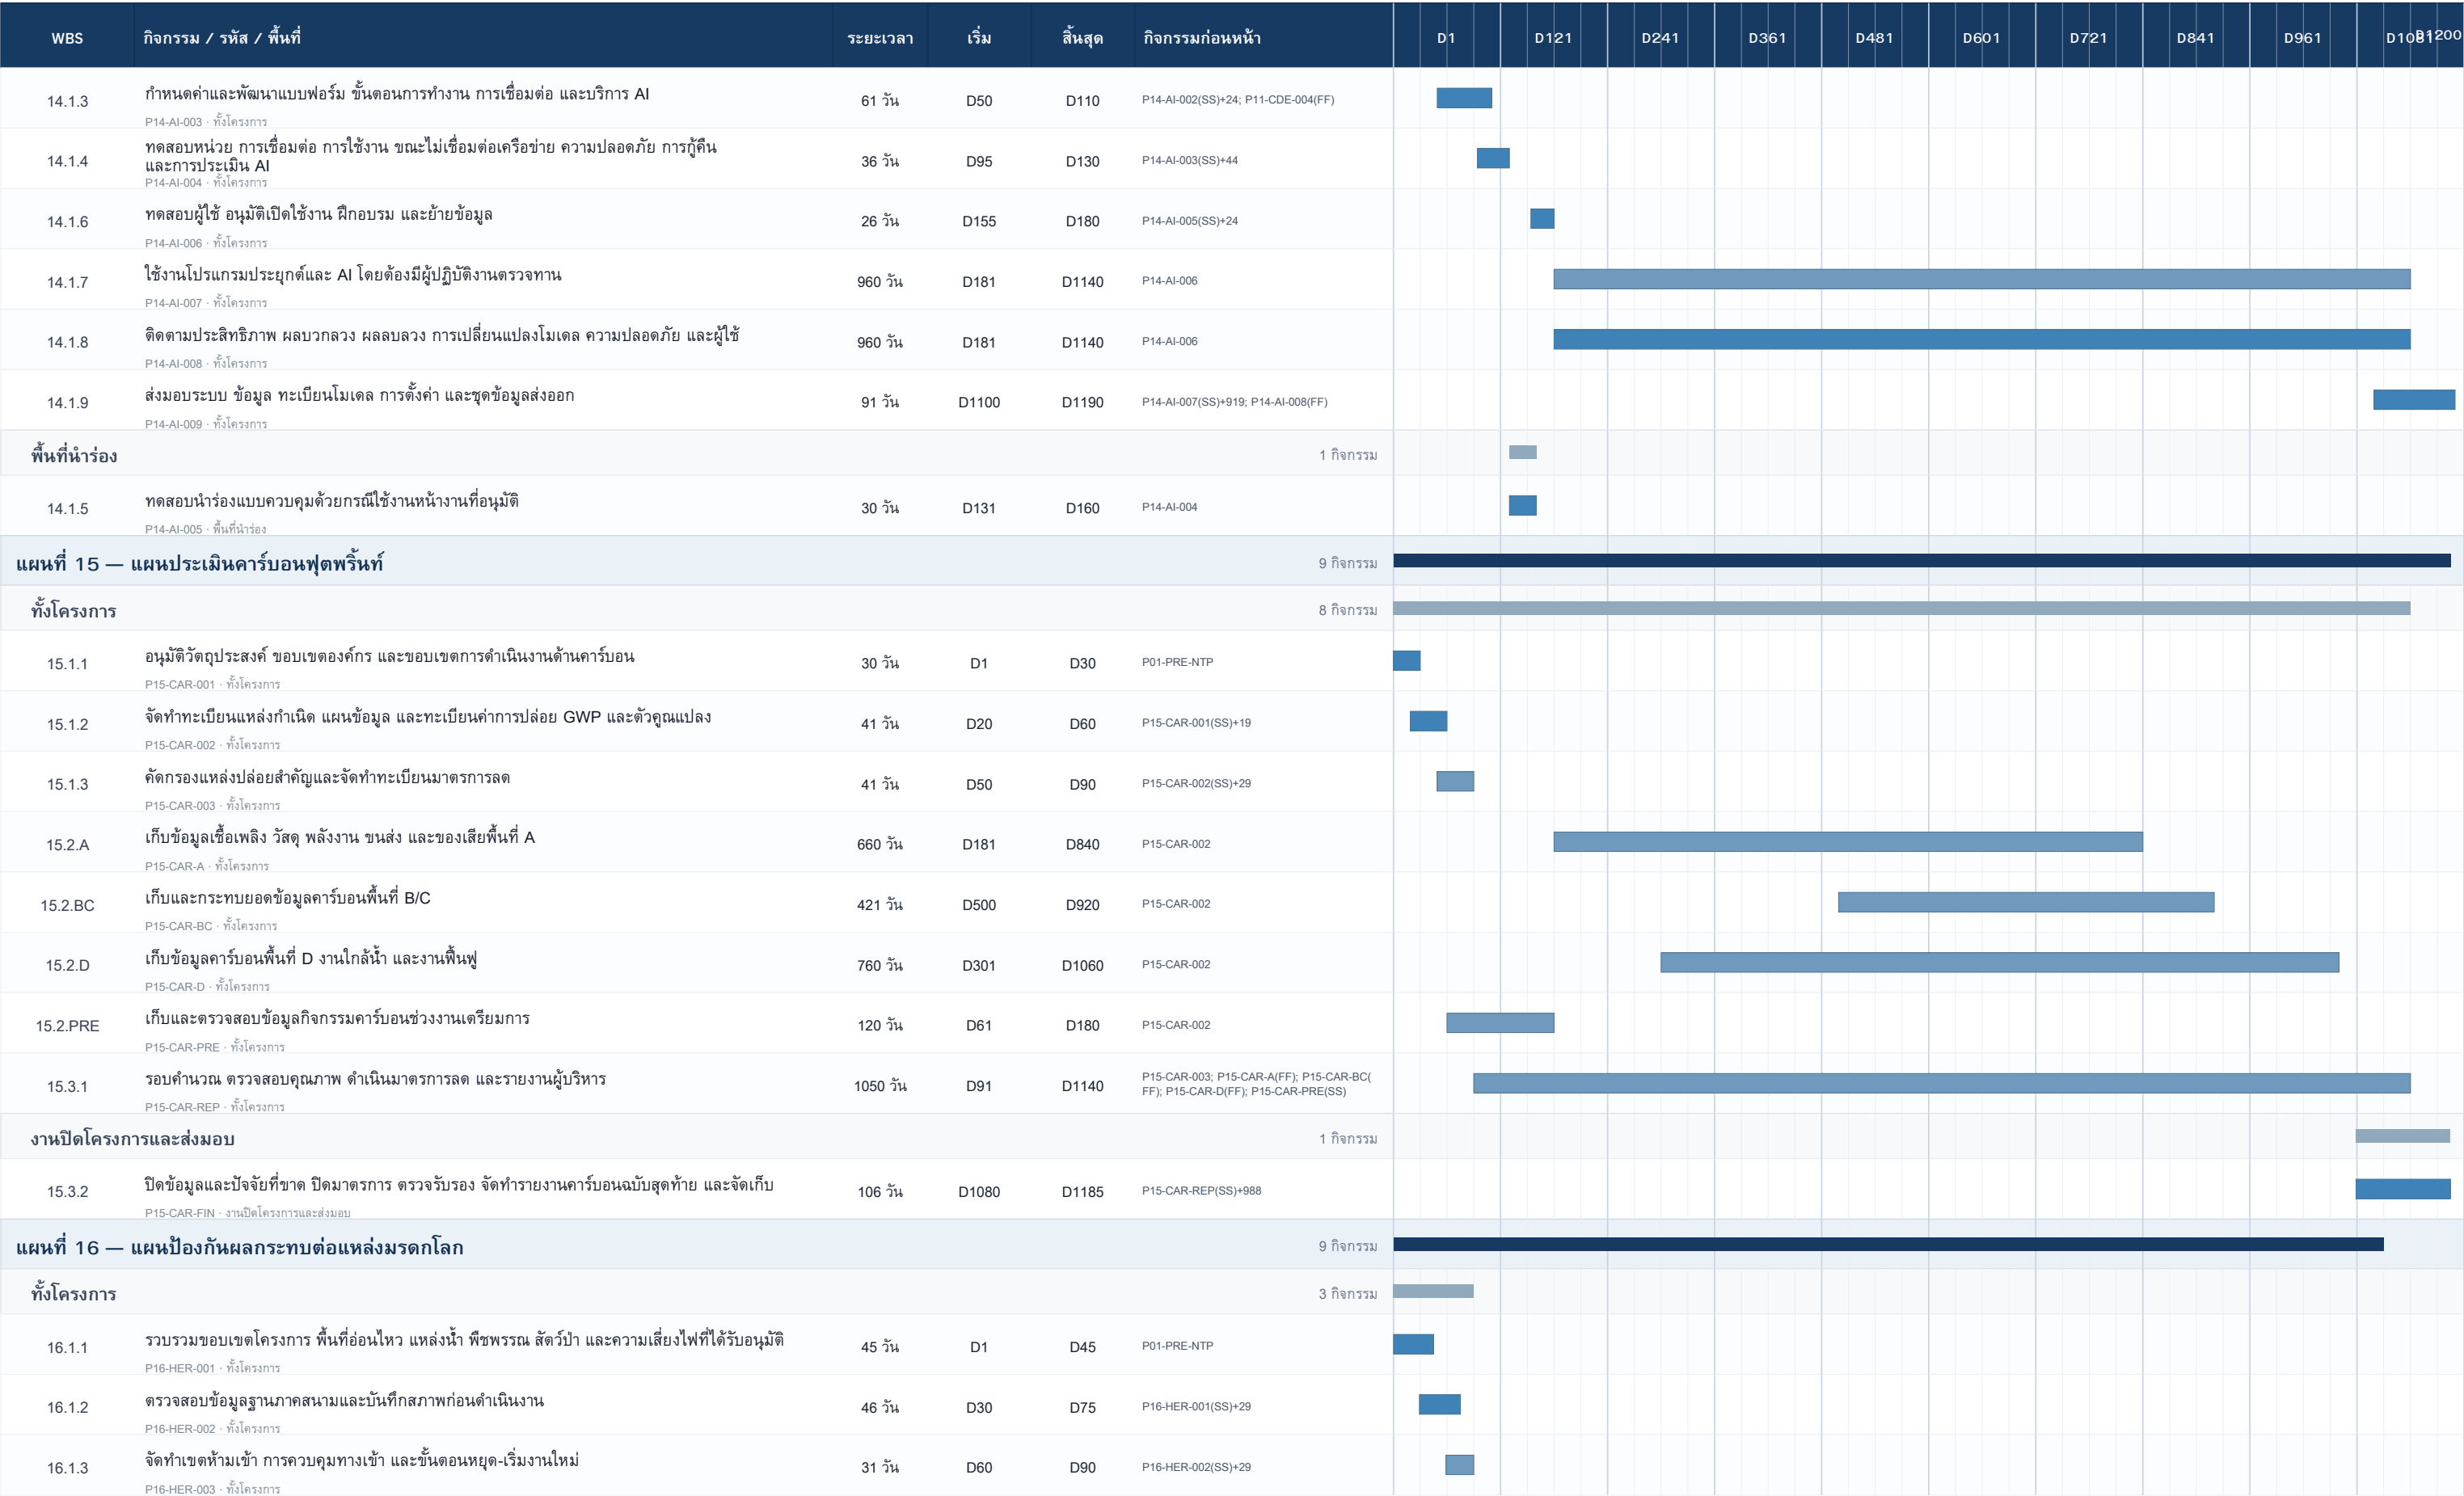

ระยะเวลา 1,200 วัน · 497 งาน · 1066 กิจกรรม · 60 กิจกรรมวิกฤต

ต่อ: แผนที่ 16 — แผนป้องกันผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก · ทั้งโครงการ

